

1-3		농산물 산지유통센터 건립 농업 활성화									
관리분야	지역경제					추진상황		정상추진			
사업구분	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별			소요사업비
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
	○		○			○			○		7,070백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2022~2026		팀 장 남가영(☎1871)			
			○	○							
주관부서	농업정책과				관련부처	해당없음					

□ 사업 개요

- 사업목표 : 농산물 산지유통센터의 건립으로 농가수익증대 및 농촌인력 부족해소
- 사업위치 : 홍성군내
- 사업규모 : 산지유통센터건립(2동 1,650㎡, 저온저장, 선별실, 작업장, 사무실) 장비구입(유통차량, 선별기, 포장기, 파렛트, 지게차 등)
- 사업내용 : 농산물의 규격화, 상품화에 필요한 집하·선별, 포장 및 출하등의 복합기능을 갖춘 산지유통시설의 건립

□ 그동안 추진실적

- 2021. 7. : 원예산업발전계획 수립을 위한 실무위원회 구성(7명)
- 2022. 6. : 산지유통활성화 시군순회 간담회 개최(홍성군농업기술센터, 14명)
- 2022. 9. 19. : 홍성농정발전 포럼개최(군청회의실, 25명, 산지유통센터 설립방향 주제발표 및 토론)
- 2022. 11. : 산지유통센터 건립 타당성용역 예산반영(22백만원)
- 2022. 11. : 홍성군산지유통센터건립을 위한 타당성 검토 용역 추진계획 수립
- 2023. 3.~7. : 홍성군 산지유통센터 건립을 위한 타당성 검토 용역
 - ⇒ 기존 지역농협에서 운영하고 있는 APC 유사 시설 활용하여 2~3개의 품목으로 2가지 모델 중소규모의 APC 설립 추진

<구근, 양념채소류 중심 APC>
✓ 서부권역
✓ 마늘, 양파, 감자 등
☞ 서부농협 산지유통시설 추진 중

<과수, 과채류 중심 APC>
✓ 홍성, 홍북, 금마권역
✓ 딸기, 방울토마토, 오이 등
☞ 지역농협 지속적 협의 및 설득

※ 서부농협 산지유통시설(홍성마늘) 건립 추진현황

- 위치 : 홍성군 서부면 광리 730-4
- 면적 : 대지 6,241㎡, 건축 2,868㎡(기존 2,306 증축 562)
- 시설 : 저온저장고, 선별장, 창고, 상품화기계(선별기 및 포장기계)

- 지원내역

- 2021. 8. : 충남오감주관농협지원사업 추진(포장기계 구입, 집하시설 보수)
- 2022. 1. : 유통시설현대화 사업 추진(저온저장고 및 선별장(492㎡), 창고(70㎡))
- 2023. 3. : 농산물 유통시설 현대화 보완사업 추진(인테리어 300대)
- 2022. ~ 2023. : 공선출하 생산자조직 육성사업(2년차 사업)
- 2023. 9. : 2024년 저온유통체계 구축사업 농식품부 공모 선정
- 2024. 1. : 우수 농산물산지유통센터 견학(논산, 부여, 당진)
- 2024. 3. : 농산물산지유통센터 건립을 위한 간담회 실시

□ 문제점 및 대책

- 국·도비 보조사업의 경우 신청자격에 미달하여 준비만으로 추진하여야 함
⇒ 기존 지역농협에서 운영하고 있는 유사시설을 활용하여 예산절감 추진
- 연중 산지유통센터를 가동할 수 있는 대표품목과 취급물량 부족, 운영비 문제 (적자)로 주도적 운영조직 부재
⇒ 선별비, 물류비 등 산지조직 육성비용 지원 등의 적극적 대안 제시로 지역 농협으로 하여금 통합마케팅조직(조합공동법인) 구성토록 추진

□ 향후 추진계획

- 2024. : 산지유통센터 건립 기본계획 수립, 농가 조직화 및 공선출하회 구성, 산지유통센터 운영조직 구성을 위해 지역농협과 지속적 협의와 설득
- 2025. : 사업예산 반영, 통합마케팅조직 구성, 건축물 설계 및 착공
- 2026. : 건축물 완공 및 유통·선별·포장장비 구입, 농산물 산지유통센터 운영

□ 연차별 추진계획

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	산지유통활성화 사군간담회 및 홍성농장발전포럼 추진	산지유통센터 건립 타당성 검토용역 완료 통합조직 구축 관련 지속협약	통합조직 구축 관련 지속협약, 산지유통센터 건립기본계획 수립	통합조직 구성 건축설계 및 착공	건축완공 및 유통선별·포장 장비 구입, 산지유통센터 운영	산지유통센터 운영

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
타당성검토용역	20	-	20	-	-	-	-	-
기본계획수립	50	-	-	-	50	-	-	-
기반조성	1,000	-	-	-	-	1,000	-	-
유통센터건립	6,000	-	-	-	-	3,000	3,000	-

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	7,070	-	20	-	50	4,000	3,000	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	5,270	-	20	-	50	3,100	2,100	-
기 타	1,800	-	-	-	-	900	900	-

□ 연차별 재원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	22	20	22 (이월)	-	-	20	-	-	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	22	20	22	-	-	20	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표


구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	산지유통센터건립	개소	1	-	타당성검토용역실시 완료	기본계획 수립	-	1	-
실적			-	-	타당성검토용역실시 완료	-	-	-	-
달성			-	-	달성	-	-	-	-

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
-	-	-	-	2(포럼, 간담회)

□ **증빙자료 첨부**

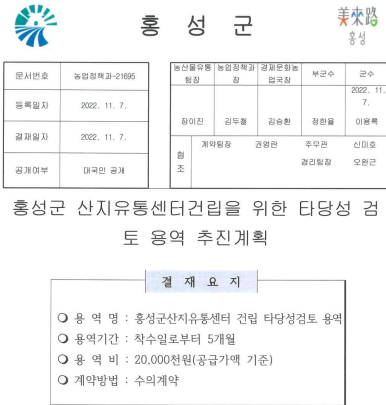


홍성군 산지유통센터건립을 위한 타당성 검토 용역 추진계획

결재요지


- 용역명 : 홍성군산지유통센터 건립 타당성검토 용역
- 용역기간 : 착수일로부터 5개월
- 용역비 : 20,000천원(공급가액 기준)
- 계약방법 : 수의계약

경제문화농업국
(농업정책과)



홍성군 산지유통센터건립 타당성 검토 용역


2023.07.03.

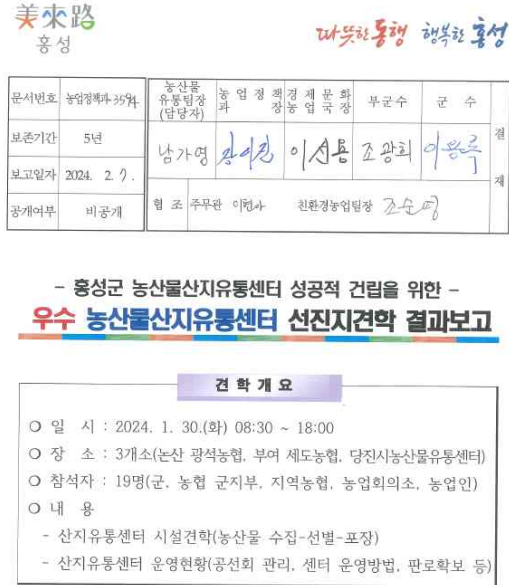

- 홍성군 농산물산지유통센터 성공적 건립을 위한 -
우수 농산물산지유통센터 선진지견학 결과보고

견학개요

- 일시 : 2024. 1. 30.(화) 08:30 ~ 18:00
- 장소 : 3개소(논산 광석농협, 부여 세도농협, 당진시농산물유통센터)
- 참석자 : 19명(군, 농협 군지부, 지역농협, 농업회의소, 농업인)
- 내용
 - 산지유통센터 시설견학(농산물 수집-선별-포장)
 - 산지유통센터 운영현황(공선외 관리, 센터 운영방법, 판로확보 등)



농산물산지유통센터 건립을 위한 간담회 계획

- ❖ 우리지역 실정에 맞는 성공적인 농산물산지유통센터 건립 방안 모색을 위한 관계기관 및 농업인과의 간담회 개최

□ 행사 개요

- (일시) 2024. 3. 21.(목) 16:00~18:00
- (장소) 농업기술센터 회의실(2층)
- (참석대상) 농업기술센터, 농협중앙회 홍성군지부, 지역농협, 농어업회의소(농업관련단체 및 농업인) 등
- (주요내용)
 - 농산물산지유통센터건립 타당성 검토 용역 결과 공유
 - 우수 농산물산지유통센터 선진지 견학 결과 공유
 - 농산물산지유통센터 건립을 위한 의견수렴 및 방안모색 등

□ 주요일정

시 간	주 요 내 용	비 고
16:00~16:03	3' 참석자 소개	농산물유통팀장
16:03~16:05	2' 인사말씀	농업정책과장
16:05~16:30	25' 용역 및 선진지 견학 결과 공유	농산물유통팀장
16:30~17:30	60' 토론 및 의견수렴	참석자
17:30~17:35	5' 정리 및 폐회	농산물유통팀장
