

1-22

## 도심지역 전선 지중화 확충

관리분야	지역경제					추진상황		정상추진			
	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별			소요사업비
사업구분	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
			○	○			○			○	○
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2018~2025			팀	장	황영순(☎1846) 이후영(☎1738) 이관엽(☎1942) 최승철(☎1941) 정진규(☎1940) 김민지(☎1754)
			○						담당자	담당자	
주관부서	도시재생과				관련부처	충청남도			담당자	담당자	

## □ 사업 개요

## ○ 사업목표

- 구도심의 난잡한 전력·통신선 지중화로 도시미관 및 도로환경 개선
- 차도 및 보도의 지장물(전주) 매설에 따른 보행자 통행로 확보 및 교통시야 개선

## ○ 사업대상 : 홍성군

## ○ 사업내용 : 전력·통신선로 지중화 3건

- 장군상오거리~홍성역사거리 지중화사업(L=0.55km / 한전주 40분, 통신주 33분)
- 오관구역 주거환경개선 지중화사업(L=0.28km)
- 홍성역세권 지중화사업(L=16.73km)

## □ 그동안 추진실적

사업명	추진실적	비고
장군상오거리~ 홍성역사거리	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2021. 4. 한전 협약 체결</li> <li>• 2023. 4. 통신(LG유플러스, 드림라인, SK텔레콤, SK브로드밴드, LG헬로비전, 세종텔레콤), 케이티 협약 체결</li> <li>• 2023. 10. 지중화공사 및 임시포장 공사 착공</li> <li>• 2024. 4. 지중화(굴착) 사업(도로구간) 완료</li> </ul>	추진중
오관구역 주거환경개선	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2018. 6. 한전 협약 체결</li> <li>• 2019. 9. 통신(SK브로드밴드, LG유플러스, CJ헬로) 협약 체결</li> <li>• 2022. 2. 지중화 공사 착공</li> </ul>	추진중
홍성역세권	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2022. 6. 한전 계약 체결</li> <li>• 2023. 1. 지중화 공사 착공</li> <li>• 2023. 9. 지중화 사업 완료</li> </ul>	완료

□ 문제점 및 대책

- 오관구역 주거환경개선사업(LH공동주택) 사업추진 지연에 따른 지중화 공사 및 도시계획도로 개설 추진 지연  
 → 공동주택 진입도로 공사를 우선 추진하여 지중화 공사 2025년까지 완료 추진

□ 향후 추진계획

사업명	향후계획	비고
장군상오거리~홍성역사거리	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2024. 5. 지중화(굴착) 사업(보도 등 잔여구간) 완료</li> <li>지중화 사업 대상지 복구공사 완료</li> </ul>	
오관구역 주거환경개선	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2025. 12. 지중화 사업 완료</li> </ul>	

□ 연차별 추진계획

비고	2022년	2023년	2024년	2025년	임기 후
장군상오거리~홍성역사거리	협약체결(한전)	협약체결(통신) 사업착공	사업완료	-	-
오관구역 주거환경개선	사업진행중	사업진행중	사업진행중	사업완료	-
홍성역세권	협약체결 사업착공	사업완료	-	-	-

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
총 사업비 (군 비)	8,354 (3,638)	781 (391)	5,239 (1,930)	1,100 (550)	1,234 (767)	-	-	-
장군상오거리~ 홍성역사거리	3,434 (1,867)	-	1,100 (550)	1,100 (550)	1,234 (767)	-	-	-
오관구역 주거환경개선	781 (391)	781 (391)	-	-	-	-	-	-
홍성역세권	4,139 (1,380)	-	4,139 (1,380)	-	-	-	-	-

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	8,354	781	5,239	1,100	1,234	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	3,638	391	1,930	550	767	-	-	-
기 타	4,716	390	3,309	550	467	-	-	-

□ 연차별 재원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	7,573	5,789	5,239	5,239	1,100	550	1,234	-	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	3,247	2,480	1,930	1,930	550	550	767	-	-	-	-	-
기 타	4,326	3,309	3,309	3,309	550	-	467	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	도심지역 전선 지중화 사업	개소	3	-	1	1	1	-	-
실적			3	-	1	0.5	-	-	-
달성			3	-	달성	추진중	-	-	-

□ **군민 소통 현황**


(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
-	-	-	-	-

□ **증빙자료 첨부**



사업명	홍성 역세권 지중화(완료)	사업기간	2022년~2023년
-----	----------------	------	-------------

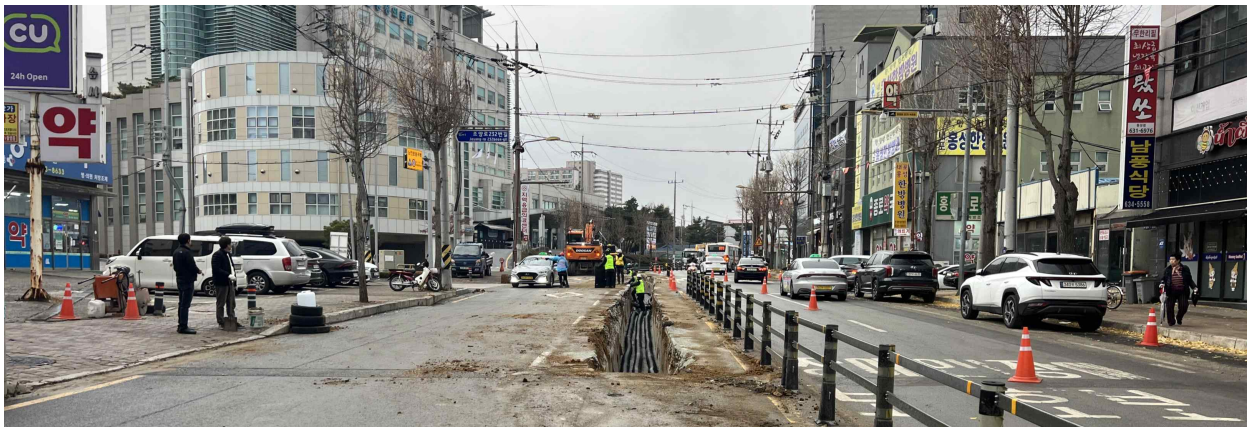

사업명	장군상오거리~홍성역사거리(공사중)	사업기간	2021년~2024년
-----	--------------------	------	-------------

□ **공약 변경사항**

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비 고
1-22	도심지역 전선 지중화 사업	소요사업비 변경	7,226백만원→ 8,354백만원	23. 11.	공약이행평 가단 의결
		사업기간 변경	당초: 2020~2025 변경: 2018~2026		
