

5-6

홍북읍 소재지 재정비

관리분야	균형발전				추진상황		완료			소요사업비	
	성격별	기간별(임기내)			사업비별		재원별				
사업구분	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비에산	국도비	군비	기타	
			○	○			○		○	○	
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2023~2024			팀 장 김기환(☎1842) 담당자 이충일(☎1488)		
			○								
주관부서	건설교통과				관련부처	-					

□ 사업 개요

- 사업목표 : 홍북읍 행정복지센터 신청사 건립에 따른 이용객 안전 및 편의 제공과 내포신도시 인구 증가에 따른 이용 수요 증가에 대비하여 접근성 제고
- 사업대상 : 홍성군 홍북읍 대동리 191-26 ~ 188-6번지 일원
- 사업내용 : 회전교차로 1개소, 인도 L=350m

□ 그동안 추진실적

- 2022. 10. ~ 12. : 관련실과 협의
- 2023. 1. ~ 10. : 실시설계 및 행정절차 이행
- 2023. 11. : 일상감사 및 도 계약심사 완료
- 2023. 12. : 공사 착공
- 2024. 9. : 공사 준공

□ 기대효과

- 신청사 진출입을 위한 인도 설치 및 정비로 교통환경 개선
- 신청사 이용을 위한 군도 4호선 회전교차로 설치로 이용객 안전 확보

□ 연차별 추진계획

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
	-	실시설계 추진 및 사업착공	사업완료	-	-	-

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
	1,500	0	0	1,000	500	0	0	-
공사	1,400	-	-	900	500	-	-	-
보상	0	-	-	-	-	-	-	-
기타	100	-	-	100	-	-	-	-

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	1,500	0	0	1,000	500	0	0	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	500	-	-	500	-	-	-	-
군 비	1,000	-	-	500	500	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 재원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	1,500	1,234	-	-	1,000	40	500	1,194	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	500	500	-	-	500	20	-	480	-	-	-	-
군 비	1,000	734	-	-	500	20	500	714	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표


구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	홍북읍 소재지 재정비	-	준공	-	실시설계 추진 및 사업 착공	사업완료	-	-	-
실적		-	-	-	2	1	-	-	-
달성		-	-	-	달성	달성	-	-	-

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
1	1	-	-	-

□ **위치도**

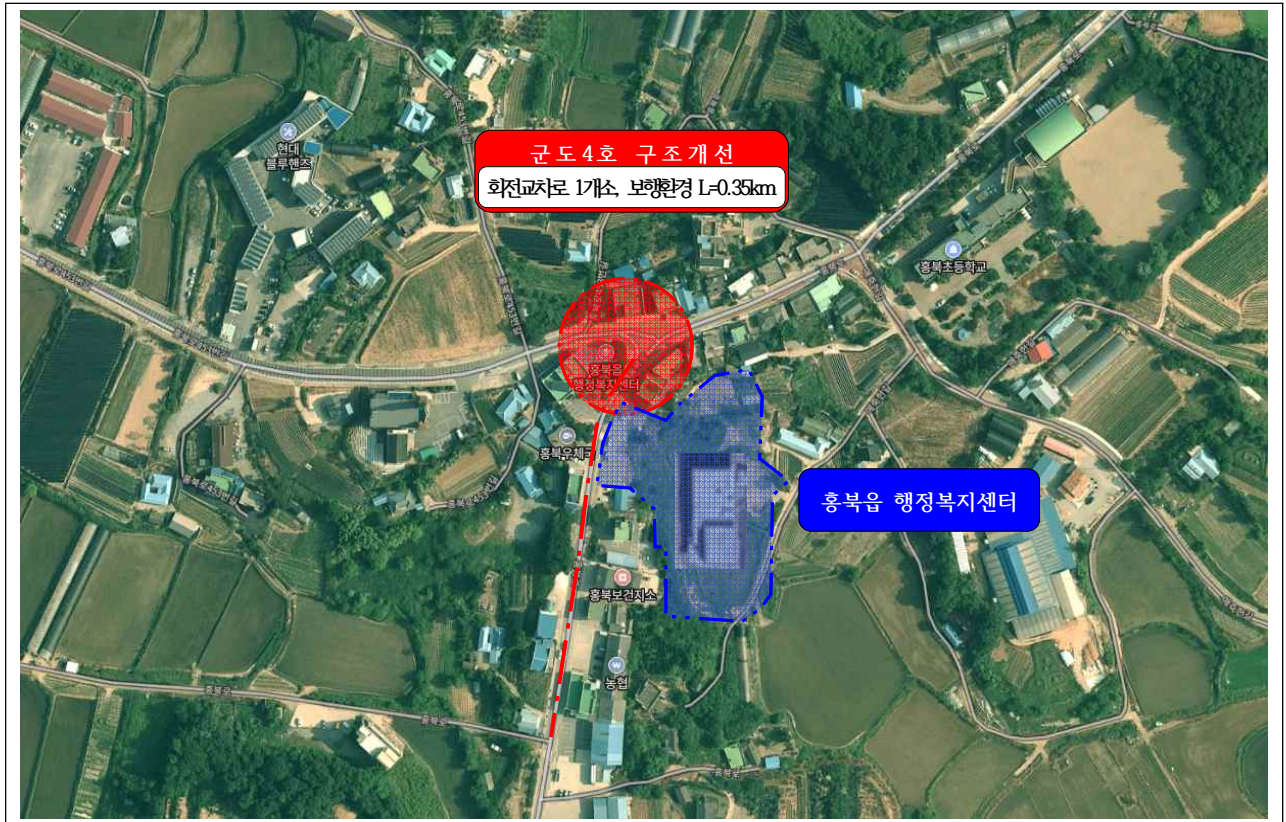

□ **공약 변경사항**

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비 고
5-6	홍북읍 소재지 재정비	사업비 변경 연차별 투자계획	1,000백만원→ 1,500백만원	24. 4.	공약 이행평가단 의결
