5-8 금마면 마을단위 LPG 배관망 지원사업 추진

관리분야	균형발전					추진	상황	정상추진				
110174	성기				내기내) 		비별	재원별		-1-1	소요사업비	
사업구분	신규	계속	완료	작수	기반조성	예산	비예산	국노비	<u> 건비</u>	기타	800백만원	
사업주체	국가	토	자체	민간	사업기	 기강ト	202	4~20	<u> </u>	팀	장 이동연(☎1590)	
		-1-0-	<u> </u>							급 % 이동한(☆1590) 담당자 유병성(☎1597)		
주관부서		경제건	정책과		관련되	관련부처 산업통			산업통상자원부		0 1 11 0 0 (1311)	

□ 사업 개요

O 사업목표 : 도시가스 미공급 농어촌지역 주민의 연료사용 환경 개선

O 사업대상 : 금마면 장파마을

○ 사업내용: LPG 소형저장탱크 및 가스시설(가스배관 및 보일러) 설치 지원

□ 그동안 추진실적

○ 2022. 9. 2. : 5개년('23~'27년) 수요조사서 道 제출(금마면 '24년 사업추진)

O 2023. 5. 31.: 5개년('24~'28년) 수요조사서 道 제출(금마면 '24년 사업추진)

○ 2023. 10. 17. : 道 예산 확보

○ 2023. 11. 21. : 한국LPG배관망사업단 기본계획 실시

○ 2023. 12. 28. : 연차 사업으로 추진 검토보고

○ 2024. 2. : 주민 설명회 시행

○ 2024. 3. : 참여자 신청서 접수

O 2024. 8. : 공사 착공

○ 2024. 9.: 25년도 사업비(도비) 가내시

□ 문제점 및 대책

- 마을단위 LPG 배관망 지원사업은 국·도비 보조사업으로서 읍·면 수요조사 시행으로 매년 1~2개 사업대상지를 선정·추진
- O 2024년도는 도비지원으로 2개 마을 추진(금마면 장파마을, 홍북읍 홍천문화2차마을)
- O 한국LPG배관망사업단의 최종계획 실시결과 사업비가 800백만원 산정되어 재정부담 완화를 위해 연차사업('24~'25) 추진 불가피
 - 참여 세대수 및 세대간 거리에 따라 시업비가 산정되며(배관 연장) 마을당 4억의 기본시업비를 기준으로 하나, 장파마을의 경우 면적이 크고 참여세대수가 많아 두 개 구역으로 나누어 추진코자 함

□ 향후 추진계획

O 2024. 11. : 준공

○ 2025. 2.: 2차사업 추진

□ 연차별 추진계획

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	_	LPG배관망 지원사업신청 (충청남도)	1차구간 추진	2 차구간 추진	-	-

□ 연차별 투자계획

O 사업별

(단위:백만원)

연도별	-J]	-J]]	-1 E -1			-L -		
사업별	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	향후
금마면 마을단위								
LPG 배관망	800	_	_	_	400	400	_	_
지원사업								

O 재원별

(단위:백만원)

O	년도별	الح	-1 E -1		임기 중 투자계획						
재원병	道	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	향후		
소	계	800	_	-	-	400	400	-	-		
국	비]	_	_	_	_	_	_	_	1		
도	비]	400	_	_	_	200	200	_	1		
군	비]	320	_	_	_	160	160	_	-		
7]	타	80	_	_	_	40	40	_	ı		

□ 연차별 재원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

연도별		계		임기 중 확보 및 집행내역										
\		àl⊔	ス ┃ゔ゚゚	202	2년	202	3년	202	4년	202	5년	2026년		
재원	2	확보 집행		확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	
소	계	400	_	-	_	_	-	400	_	_	_	_	_	
국	비	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	-	
도	H]	200	_	-	_	_	_	200	_	_	_	_	-	
군	비]	160	_	_	_	_	_	160	_	_	_	_	_	
기	타	40	_	_	_	_	_	40	_	_	_	_	_	

□ 공약달성 확인지표


구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획				_	_	1	1	_	-
실적	LPG 배관망 설치	개소	2	-	-	추진중	추진중	-	-
달성	บ			_	-	추진중	추진중	-	-

□ 군민 소통 현황

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
1	1	-	-	-

□ 증빙자료 (저장탱크 설치부지에 별모양 표식)

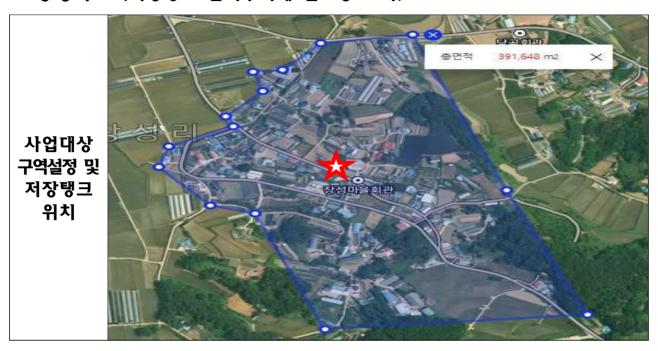

□ 공약 변경사항

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비고
		사업기간	당초: 2023~2024 변경: 2024	23. 11.	
5-8	금마면 마을단위 LPG 배관망 지원사업 추진	사업기간 사업비 연차별추진계획 연차별투자계획 공약달성 확인지표	당초: 2024 변경: 2024~2025 당초: 400백만원 변경: 1,399백만원	24. 4.	공약이행 평가단 의결
		사업비 연차별 투자계획	당초: 1,399백만원 변경: 800백만원	24. 11.	
