

5-13

은하면 대판 금곡 도로개설

| 관리분야 | 균형발전 | | | | 추진상황 | | 정상추진 | | | | |
|------|-------|----------|----|----|------|-----------|------|-----|----------------------------------|-------|----|
| | 성격별 | 기간별(임기내) | | | 사업비별 | | 재원별 | | | 소요사업비 | |
| 사업구분 | 신규 | 계속 | 완료 | 착수 | 기반조성 | 예산 | 비예산 | 국도비 | 군비 | | 기타 |
| | | | ○ | ○ | | | ○ | | | ○ | |
| 사업주체 | 국가 | 도 | 자체 | 민간 | 사업기간 | 2023~2027 | | | 팀 장 김기환(☎1842) 담당자 박상빈(☎1446) | | |
| | | | ○ | | | | | | | | |
| 주관부서 | 건설교통과 | | | | 관련부처 | - | | | | | |

□ 사업 개요

- 사업목표 : 농어촌도로 확포장을 통한 농촌지역 마을간 효율적인 농경지 접근 편의 제공과 농촌지역에서 생산되는 농산물의 원활한 유통을 위한 교통 여건 개선
- 사업대상 : 은하면 대판리 23 ~ 결성면 금곡리 259번지 일원
- 사업내용 : 도로 확포장 L=2.9km, B=8.0m

□ 그동안 추진실적

- 2022. 8. ~ 10. : 농어촌도로 기본 및 정비계획 연차별 투자계획 반영
- 2022. 10. ~ 12. : 도로확포장 사업 동의서 확보
- 2023. 7. : 사업동의서 확보 결과에 따른 추경예산 확보
- 2023. 8. : 실시설계용역 착수
- 2024. 3. : 주민설명회 개최
- 2024. 5. : 행정절차 이행(산지, 농지, 소규모 환경, 재해영향평가 등)

□ 향후 추진계획

- 2025. 1. ~ : 보상협의 추진
- 2026. 1. ~ 2027. 12. : 사업 발주 및 준공

□ 기대효과

- 지역주민, 마을버스 및 축산 관련 대형 차량 통행이 많은 구간으로 안전한 보행환경 제공 및 교통여건 개선으로 교통편의 증진

□ 연차별 추진계획

| 구 분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|------|----------|---------|-------|-------|------------|-------------|
| 추진계획 | 사업동의서 확보 | 실시설계 추진 | 행정절차 | 보상협의 | 보상협의, 사업착공 | 사업완료 ('27년) |

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위:백만원)

| 연도별 사업별 | 계 | 기투자 | 임기 중 투자계획 | | | | | 향후 |
|------------|-------|-----|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |
| | 4,400 | - | - | 200 | 50 | 500 | 1,700 | 1,950 |
| 공사 | 2,950 | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,950 |
| 보상 | 1,250 | - | - | - | 50 | 500 | 700 | - |
| 기타 | 200 | - | - | 200 | - | - | - | - |

○ 재원별

(단위:백만원)

| 연도별 재원별 | 계 | 기투자 | 임기 중 투자계획 | | | | | 향후 |
|------------|-------|-----|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |
| 소 계 | 4,400 | - | - | 200 | 50 | 500 | 1,700 | 1,950 |
| 국 비 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 도 비 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 군 비 | 4,400 | - | - | 200 | 50 | 500 | 1,700 | 1,950 |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 연차별 재원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

| 연도별 재원별 | 계 | | 임기 중 확보 및 집행내역 | | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
| | 확보 | 집행 | 2022년 | | 2023년 | | 2024년 | | 2025년 | | 2026년 | |
| | | | 확보 | 집행 | 확보 | 집행 | 확보 | 집행 | 확보 | 집행 | 확보 | 집행 |
| 소 계 | 250 | 115 | - | - | 200 | 62 | 50 | 53 | - | - | - | - |
| 국 비 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 도 비 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 군 비 | 250 | 115 | - | - | 200 | 62 | 50 | 53 | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 공약달성 확인지표


| 구분 | 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기후 |
|----|--------------|----|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 계획 | 농어촌도로 확포장 | - | 도로 확포장 | - | 설계추진 | 행정절차 | 보상협의 | 사업착공 | 사업준공 |
| 실적 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 달성 | 추진중 | - | - | - | 추진중 | 추진중 | - | - | - |

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

| 설명회·공청회 | 민간전문가 등 자문 | 언론·방송보도 | 설문조사 | 기타 |
|---------|------------|---------|------|----|
| 1 | - | - | - | - |

□ **위치도**

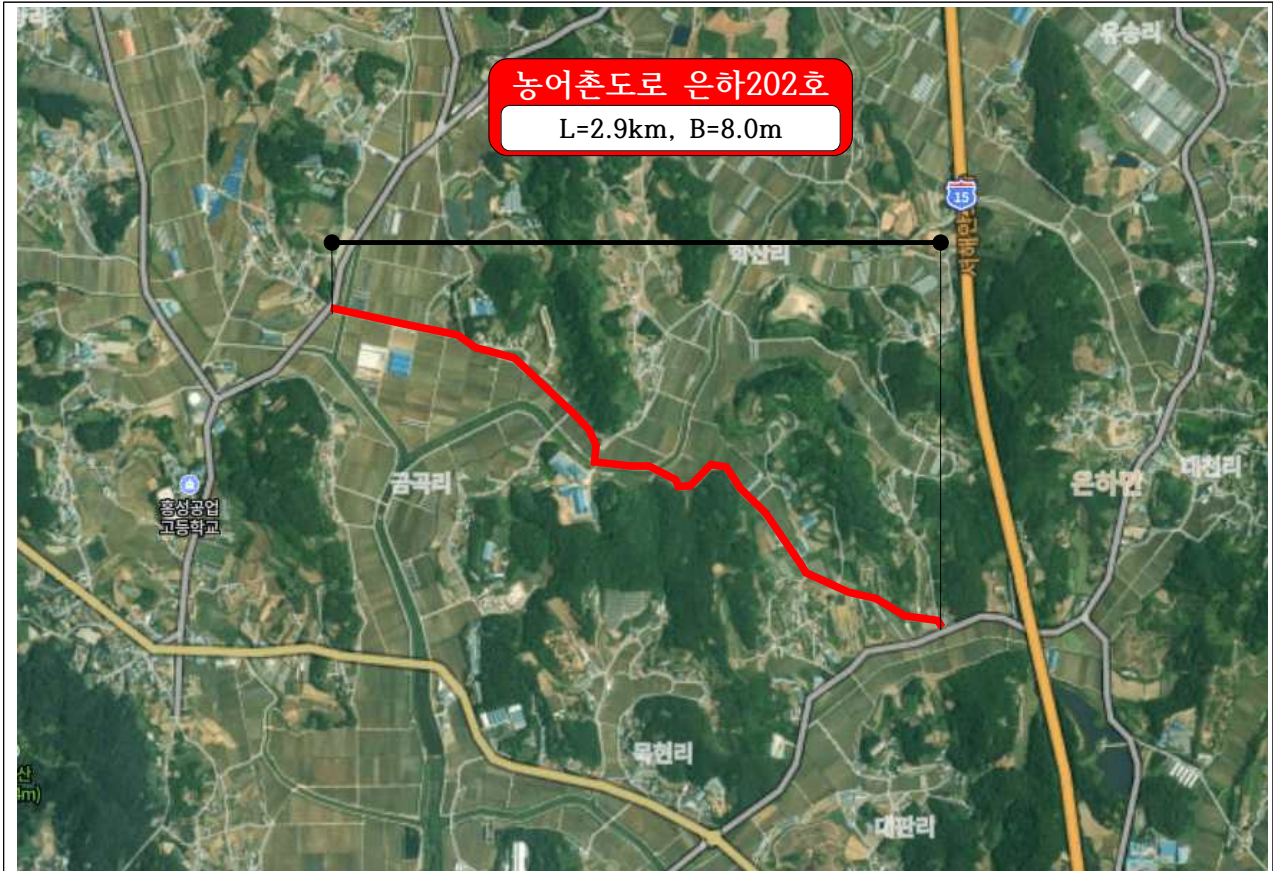

□ **공약 변경사항**

| 관리번호 | 공약명 | 변경구분 | 변경내용 | 변경일 | 비고 |
|------|----------------|---|---------------------------|---------|-------------------|
| 5-13 | 은하면 대판 금곡 도로개설 | 연차별 투자계획 | 2024년 200백만원→ 50백만원 | 24. 4. | 공약이행 평가단 의결 |
| | | 사업기간 연차별 추진계획 연차별 투자계획 공약달성 확인지표 | 준공 2026년→2027년 | 24. 11. | |
