

3-2		용봉산 스카이워크 및 모노레일 조성 [용봉산(산림)권역 종합계획 수립]										
관리분야	문화관광					추진상황		정상추진				
사업구분	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별			소요사업비	
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타		
	○		○			○			○		400백만원	
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간		2023~2024			팀 장 박원배(☎1191) 담당자 박주열(☎1192)		
			○									
주관부서	혁신전략담당관				관련부처	충청남도						

□ 사업 개요

- 사업목표 : 내포신도시 확장 계획과 연계한 용봉산(산림)권역 관광인프라 구축 및 정주여건 개선 방안 모색
- 사업대상 : 용봉산(산림)권역 종합계획 수립
- 사업내용
 - 내포신도시 확장 계획과 연계한 용봉산(산림)권역 종합계획 수립
 - 권역개발을 위한 생활환경 및 정주여건 개선 방안 모색
 - 용봉산 관광인프라 구축 및 관광사업 발굴

□ 그동안 추진실적

- 2023. 3. 2. : 계약 의뢰
- 2023. 4. 19. : 제안서 평가위원 확정 및 평가위원회 개최 계획 수립
- 2023. 4. 25. : 제안 공모 평가 및 협상 적격자 선정
- 2023. 5. 17. : 용역 계약 및 착수
- 2023. 7. 10. : 착수 보고회 개최
- 2023. 7. 14. : 자문위원회 구성
- 2023. 9. 15. : 자문위원회(1차) 개최
- 2024. 1. 3. : 군의회 중간보고회 및 자문위원회(2차) 개최
- 2024. 1. 4. : 중간 보고회 개최

□ 문제점 및 대책

- 해당사항 없음(원활한 행정절차 추진중)

□ 향후 추진계획

- 2024. 6. : 개발대상구역 확정
- 2024. 10. : 관련부서 협의
- 2024. 12. : 최종 보고

□ 연차별 추진계획

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획		▶ 종합계획 수립 ▶ 용역 착수 ▶ 용역계속추진	▶ 최종보고 및 사업 ▶ 확정	-	-	

□ 연차별 투자계획

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	400	-	-	400	-	-	-	
국 비	-	-	-	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	-	-	-	
군 비	400	-	-	400	-	-	-	
기 타	-	-	-	-	-	-	-	

□ 연차별 재원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	400	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	400	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

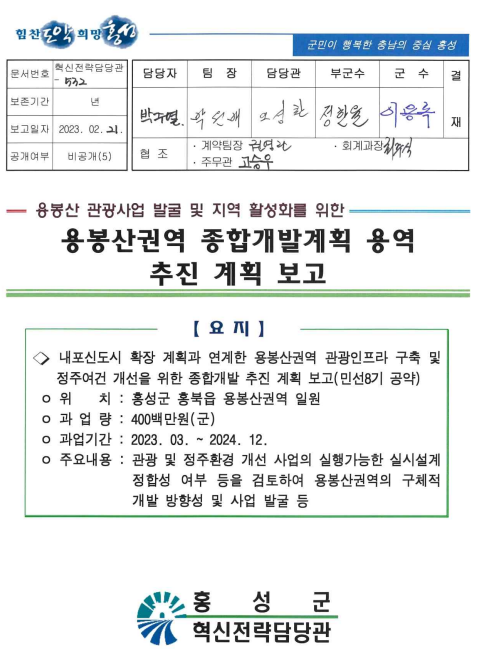
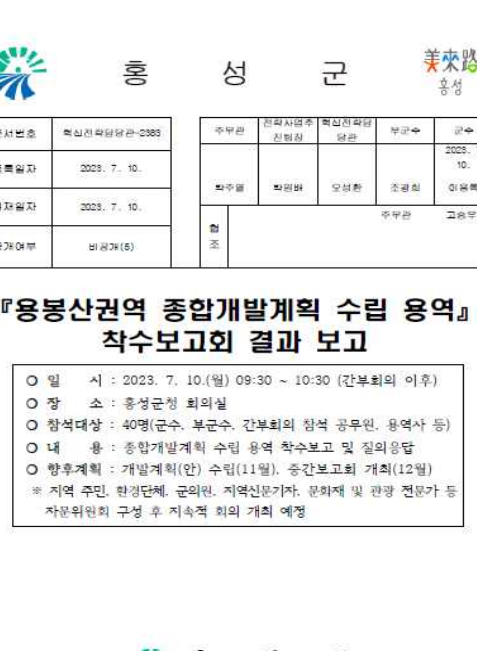
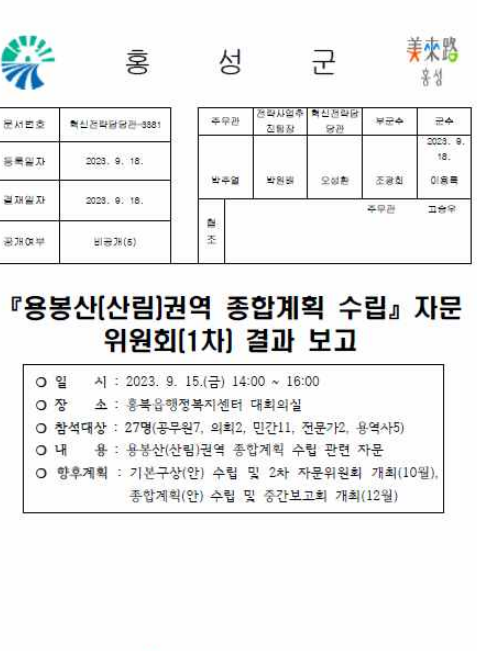
구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	용봉산 종합계획	식	용봉산 종합계획 수립	-	용역착수	용역완료	-	-	-
실적				-	용역착수	중간보고	-	-	-
달성				-	달성	추진중	-	-	-

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송·보도	설문조사	기타
-	6	1	-	-

□ **증빙자료 첨부 (공문)**


 <p>용봉산 관광사업 발굴 및 지역 활성화를 위한 용봉산권역 종합개발계획 용역 추진 계획 보고</p> <p>[요지]</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 내포신도시 확장 계획과 연계한 용봉산권역 관광인프라 구축 및 정주여건 개선을 위한 종합개발 추진 계획 보고(민선8기 공약) <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 홍성군 홍북읍 용봉산권역 일원 ○ 과 업 량 : 400백만원(군) ○ 과업기간 : 2023. 03. ~ 2024. 12. ○ 주요내용 : 관광 및 정주환경 개선 사업의 실행가능한 실시계획 정합성 여부 등을 검토하여 용봉산권역의 구체적 개발 방향성 및 사업 발굴 등 <p>홍성군 혁신전략담당관</p>	<p>착 수 계</p> <p>감독관 권유 지방시설주사 박 주 열</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 용역 명 : 용봉산권역 종합개발계획 수립 용역 2. 계약 금액 : 일금삼억칠천팔백사십만원정 (₩ 378,400,000원) 3. 계약년월일 : 2023년 05월 17일 4. 착수년월일 : 2023년 05월 17일 5. 준공예정일 : 2025년 02월 04일 <p>위와 같이 착수계를 제출합니다.</p> <p>2023년 05월 17일</p> <p>주 소 : 서충북별시 강남구 삼성로 438 상 호 : 주식회사 도화엔지니어링 대 표 이 사 : 손 영 일 인</p> <p>홍성군 수 귀하</p>
 <p>『용봉산권역 종합개발계획 수립 용역』 착수보고회 결과 보고</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 일 시 : 2023. 7. 10.(월) 09:30 ~ 10:30 (간부회의 이후) ○ 장 소 : 홍성군청 회의실 ○ 참석대상 : 40명(군수, 부군수, 간부회의 참석 공무원, 용역사 등) ○ 내 용 : 종합개발계획 수립 용역 착수보고 및 질의응답 ○ 향후계획 : 개발계획(안) 수립(11월), 중간보고회 개최(12월) ※ 지역 주민, 환경단체, 군의원, 지역신문기자, 문화재 및 관광 전문가 등 자문위원회 구성 후 지속적 회의 개최 예정 <p>홍성군 혁신전략담당관</p>	 <p>『용봉산(산림)권역 종합계획 수립』 자문 위원회(1차) 결과 보고</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 일 시 : 2023. 9. 15.(금) 14:00 ~ 16:00 ○ 장 소 : 홍북읍행정복지센터 대회의실 ○ 참석대상 : 27명(공무원7, 의회2, 민간11, 전문가2, 용역사5) ○ 내 용 : 용봉산(산림)권역 종합계획 수립 관련 자문 ○ 향후계획 : 기본구상(안) 수립 및 2차 자문위원회 개최(10월), 종합계획(안) 수립 및 중간보고회 개최(12월) <p>홍성군 혁신전략담당관</p>



문서번호	혁신전략담당관-126	주무관	전략사업추진팀장	혁신전략팀	담당	부교수	교수
발행일자	2024. 1. 8.						2024. 1. 8.
결재일자	2024. 1. 8.	박주영	박원희	오성환	조광희		이유복
공개여부	비공개(5)	주무관 연가					
		협조					

『용봉산(산림)권역 종합계획 수립』 자문 위원회(2차) 결과 보고


- 일시 : 2024. 1. 3.(수) 14:00 ~ 16:00
- 장소 : 홍복음행정복지센터 대회의실
- 참석대상 : 26명(공무원8, 민간13, 전문가2, 용역사3)
- 내용 : 용봉산(산림)권역 종합계획 수립 관련 자문
- 향후계획 : 투자유치 로드맵 수립(4월), 민간사업자 투자 설명회(6월), 관련부서 협의(10월), 최종보고회 개최(12월)



문서번호	혁신전략담당관-100	주무관	전략사업추진팀장	혁신전략팀	담당	부교수	교수
발행일자	2024. 1. 8.						2024. 1. 8.
결재일자	2024. 1. 8.	박주영	박원희	오성환	조광희		이유복
공개여부	비공개(5)	주무관 고휴우					
		협조					

『용봉산(산림)권역 종합계획 수립 용역』 중간보고회 결과 보고

- 일시 : 2024. 1. 4.(목) 09:00 ~ 10:30
- 장소 : 홍성군청 회의실
- 참석대상 : 35명(군수, 부군수, 국장 및 실과장, 사업소장, 용역사 등)
- 내용 : 용봉산(산림)권역 종합계획 수립 용역 중간보고
 - 개발여건 분석 내용, 기본구상 및 계획(안) 설명
 - 이용수요분석 및 사업추진계획 등 보고



□ 증빙자료 첨부 (보도자료)

大田日報

2023년 07월 24일 (월)
13면 지역

홍성, '용봉산 명품화 프로젝트'

관광인프라 구축·정주여건 개선 사업 발굴

【홍성】홍성군이기암괴석과 어우러진 소나무로 명성을 떨치며 '남한의 금강산'이라 불리는 용봉산의 명품화 프로젝트를 추진한다.

군은 내포신도시 확장 계획과 연계한 용봉산권역 관광인프라 구축 및 연접지역 정주여건 개선을 위한 종합개발계획 수립용역 보고회를 지난 10일과 20일 두 차례 개최했다고 밝혔다.

지난 10일 개최된 착수보고회에서 선 이용록 군수를 비롯한 간부 공무원들이 참석한 가운데 용역수행기관인 ㈜도화엔지니어링의 개발여건 분석과 기본구상, 과업 추진 계획 등의 보고와 질의응답 등으로 진행됐다.

20일 홍성군의회에서 같은 내용으로 진행된 보고회에서 의원들은 실효성 있는 사업 발굴과 주요 문

화 자원을 관광에 활용하는 개발계획을 수립해 줄 것을 홍성군에 요청했다.

군은 이번 연구용역을 통해 타지역과 차별성 있는 콘텐츠를 개발, 홍성을 대표하는 관광 배후 지역인 용봉산권역을 경쟁력과 지속력 있는 관광지로 개발해나갈 방침이다.

특히 용봉산산악관광 콘텐츠 마련과 정주인구 복합문화공간 조성 및 정주여건 개선을 위한 실현 가능한 구체적 개발방안 등을 검토해 지역의 생활환경 지도를 크게 변모시키겠다는 구상이다.

군은 향후 주민 면담 및 설문조사, 정책 자문회의, 공청회 등 다양한 채널을 통해 공감대를 형성하고, 충남도의 내포신도시 확장 계획과도 연계성을 보완해 완성도를 높일 계획이다.

이권영 기자

11.4 X 13.8 cm

관리번호	계약명	변경구분	변경내용	변경일	비 고
3-2	용봉산 스키워크 및 모노레일 조성 [용봉산권역 종합 개발계획 수립]	계약명 변경	당초: 용봉산 스키워크 및 모노레일 조성	23. 5.	계약이행평가단 심의의결
	용봉산 스키워크 및 모노레일 조성 [용봉산(산림)권역 종합계획 수립]	계약명 변경	당초: 용봉산 스키워크 및 모노레일 조성 [용봉산권역 종합 개발계획 수립]	23. 11.	계약이행평가단 심의의결
		소요사업비 변경	15,000백만원→ 400백만원		
		사업기간 변경	당초: 2023~2026 변경: 2023~2024		
