

5-8

금마면 마을단위 LPG 배관망 지원사업 추진

관리분야	균형발전				추진상황	정상추진				
사업구분	성격별		기간별(임기내)		사업비별		재원별		소요사업비	
	신규	계속	완료	착수	예산	비예산	국도비	군비		기타
		○	○		○		○	○		1,399백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2024~2025		팀 장 이동연(☎1590) 담당자 박진희(☎1597)		
주관부서	경제정책과				관련부처	산업통상자원부				

□ 사업 개요

- 사업목표 : 도시가스 미공급 농어촌지역 주민의 연료사용 환경 개선
- 사업대상 : 금마면 장파마을
- 사업내용 : LPG 소형저장탱크 및 가스시설(가스배관 및 보일러) 설치 지원

□ 그동안 추진실적

- 2022. 9. 2. : 5개년('23~'27년) 수요조사서 道 제출(금마면 '24년 사업추진)
- 2023. 5. 31. : 5개년('24~'28년) 수요조사서 道 제출(금마면 '24년 사업추진)
- 2023. 10. 17. : 道 예산 확보
- 2023. 11. 21. : 한국LPG배관망사업단 기본계획 실시
- 2023. 12. 28. : 연차 사업으로 추진 검토보고
- 2024. 2. : 주민 설명회 시행
- 2024. 3. : 참여자 신청서 접수

□ 문제점 및 대책

- 마을단위 LPG 배관망 지원사업은 국·도비 보조사업으로서 읍·면 수요조사 시행으로 매년 1~2개 사업대상지를 선정·추진
- 2024년도는 도비지원으로 2개 마을 추진(금마면 장파마을, 흥북읍 흥천문화2차마을)
- 한국LPG배관망사업단의 기본계획 실시결과 사업비가 2,333백만원(2개 마을)으로 산정되어 재정부담 완화를 위해 연차사업('24~'25) 추진 불가피
 - 참여 세대수 및 세대간 거리에 따라 사업비가 산정되며(배관 연장) 마을당 4억의 기본사업비를 기준으로 하나, 장파마을의 경우 면적이 크고 참여세대수가 많아 두 개 구역으로 나누어 추진코자 함

□ 향후 추진계획

- 2024. 4. ~ 5. : 실시 설계
- 2024. 7. ~ 11. : 착공 및 준공

□ 연차별 추진계획

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	-	LPG배관망 지원사업신청 (충청남도)	1차구간 추진	2차구간 추진	-	-

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
금마면 마을단위 LPG 배관망 지원사업	1,399	-	-	-	673	726	-	-

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	1,399	-	-	-	673	726	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	400	-	-	-	200	200	-	-
군 비	860	-	-	-	406	454	-	-
기 타	139	-	-	-	67	72	-	-

□ 연차별 재원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	427	-	-	-	-	-	427	-	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	200	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-
군 비	160	-	-	-	-	-	160	-	-	-	-	-
기 타	67	-	-	-	-	-	67	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표


구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	LPG 배관망 설치	개소	2	-	-	1	1	-	-
실적				-	-	추진중	추진중	-	-
달성				-	-	추진중	추진중	-	-

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
1	1	-	-	-

□ **증빙자료 (저장탱크 설치부지에 별모양 표시)**

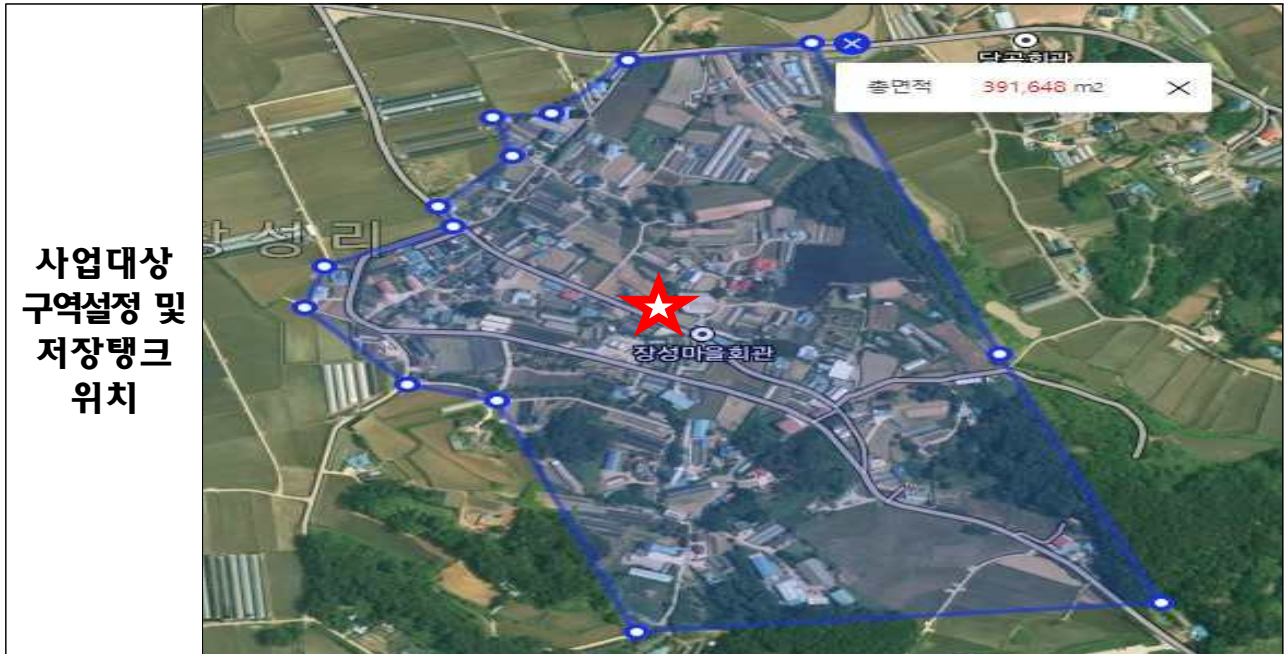

□ **공약 변경사항**

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비 고
5-8	금마면 마을단위 LPG 배관망 지원사업 추진	사업기간 변경	당초: 2023~2024 변경: 2024	23. 11.	공약이행 평가단 의결
5-8	금마면 마을단위 LPG 배관망 지원사업 추진	사업기간, 사업비 변경 연차별추진계획 연차별투자계획 공약달성확인지표	당초: 2024 변경: 2024~2025 당초: 400백만원 변경: 1,399백만원	24. 5.	
