

5-12

장곡면 행정리 저수지 주민편의시설 조성

관리분야	균형발전				추진상황	정상추진				
사업구분	성격별		기간별(임기내)		사업비별		재원별		소요사업비	
	신규	계속	완료	착수	예산	비예산	국도비	군비		기타
	○		○		○			○		522백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2023~2025		팀 장 민진기(☎1486) 담당자 김정훈(☎1491)		
			○							
주관부서	농업정책과				관련부처	한국농어촌공사				

□ 사업 개요

- 사업목표 : 천태저수지를 이용하는 마을주민 등에게 저수지 주변 주민편의시설을 조성하여 특색있는 산책 공간 조성
- 사업대상 : 장곡면 행정리(천태저수지) 일원
- 사업내용 : 편의시설 조성 1식 등
※ 총연장 371m(데크로드 연장=308, 폭B=2.0m / 야자매트 63m)

□ 그동안 추진실적

- 2022. 9. : 현장 답사 및 추진계획 수립
- 2023. 1. : 실시설계용역 착수
- 2023. 2. : 장곡면장, 행정 1, 2리 이장, 마을주민 등 의견 청취
- 2023. 3. : 실시설계관련 주민설명회 개최
- 2023. 4. : 한국농어촌공사 흥성지사 시설물설치 관련 협의 완료
- 2023. 4. : 실시설계 완료

□ 향후 추진계획

- 2024. 10. : 농업기반시설 목적외사용승인 신청 및 허가
- 2025. 2. : 공사 착공
- 2025. 6. : 공사 준공

□ 연차별 추진계획

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	-	실시설계 및 농어촌공사 협의	농업기반시설 목적외사용승인 신청	공사 추진 및 완료	-	-

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
장곡면	522	-	-	22	-	500	-	-

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
군 비	522	-	-	22	-	500	-	-

□ 연차별 재원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
군 비	22	20	-	-	22	20	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표


구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	사업완료	지구	1	-	-	토지협약	1	-	-
실적				-	실시설계	-	-	-	-
달성				-	달성	-	-	-	-

□ 군민 소통 현황

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
2	-	-	-	-

□ 증빙자료 첨부

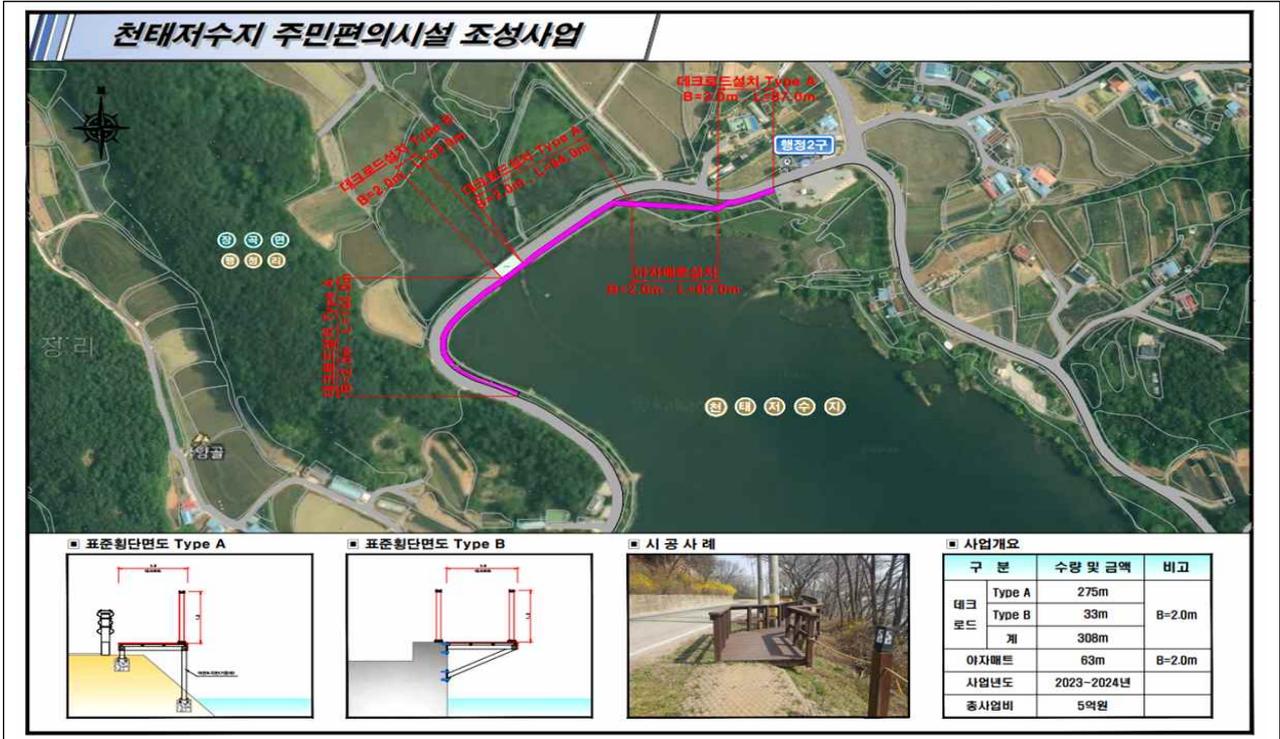

□ 공약 변경사항

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비고
5-12	장곡면 행정리 저수지 주민편의시설 조성	사업기간 변경	당초: 2023~2024 변경: 2023~2025	23. 11.	공약이행 평가단 의결
