

5-13

은하면 대판 금곡 도로개설

관리분야	균형발전				추진상황		정상추진				
	성격별	기간별(임기내)			사업비별		재원별			소요사업비	
사업구분	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비		기타
			○	○			○			○	
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2023~2026			팀 장 김기환(☎1842) 담당자 박상빈(☎1446)		
			○								
주관부서	건설교통과				관련부처	-					

□ 사업 개요

- 사업목표 : 농어촌도로 확포장을 통한 농촌지역 마을간 효율적인 농경지 접근 편의 제공과 농촌지역에서 생산되는 농산물의 원활한 유통을 위한 교통 여건 개선
- 사업대상 : 은하면 대판리 23 ~ 결성면 금곡리 259번지 일원
- 사업내용 : 도로 확포장 L=2.9km, B=8.0m

□ 그동안 추진실적

- 2022. 8. ~ 10. : 농어촌도로 기본 및 정비계획 연차별 투자계획 반영
- 2022. 10. ~ 12. : 도로확포장 사업 동의서 확보
- 2023. 7. : 사업동의서 확보 결과에 따른 추경예산 확보
- 2023. 8. : 실시설계용역 착수
- 2024. 3. : 주민설명회 개최

□ 향후 추진계획

- 2024. 5. : 행정절차 이행(산지, 농지, 소규모 환경, 재해영향평가 등)
- 2024. 6. ~ : 보상협의 추진
- 2026. 12. : 사업 완료

□ 기대효과

- 지역주민, 마을버스 및 축산 관련 대형 차량 통행이 많은 구간으로 안전한 보행환경 제공 및 교통여건 개선으로 교통편의 증진

□ 연차별 추진계획

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	사업동의서 확보	실시설계 추진	행정절차, 보상협의	사업착공, 보상협의	사업완료	-

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
	4,400	-	-	200	50	2,000	2,150	-
공사	2,950	-	-	-	-	800	2,150	-
보상	1,250	-	-	-	50	1,200	-	-
기타	200	-	-	200	-	-	-	-

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	4,400	-	-	200	50	2,000	2,150	0
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	4,400	-	-	200	50	2,000	2,150	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 재원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	250	62	-	-	200	62	50	-	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	250	62	-	-	200	62	50	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표


구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	농어촌도로 확포장	-	도로 확포장	-	설계추진	행정절차, 보상협의	사업착공	사업준공	-
실적	3	-	-	-	1	2	-	-	-
달성	추진중	-	-	-	추진중	추진중	-	-	-

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
1	-	-	-	-

□ **위치도**

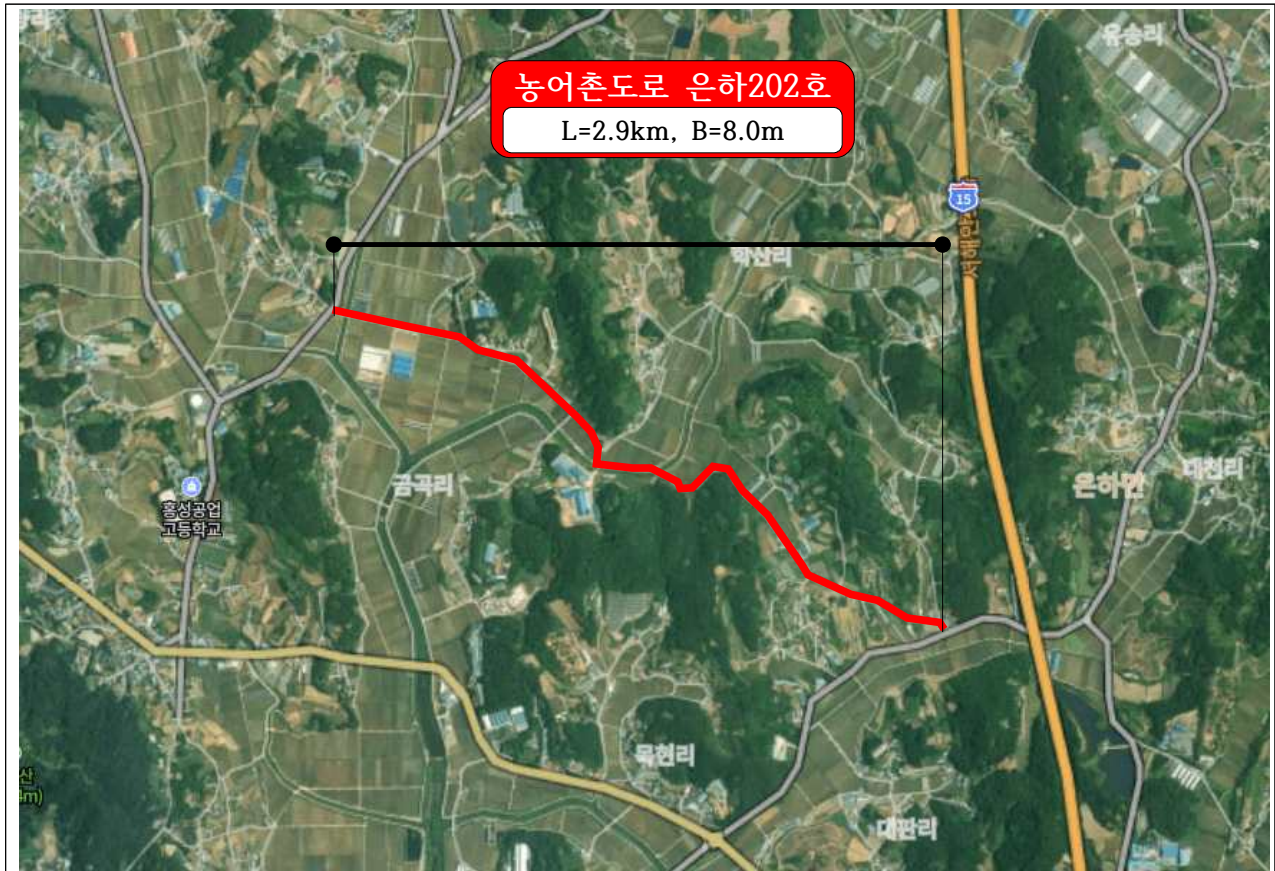

□ **공약 변경사항**

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비 고
5-13	은하면 대판 금곡 도로개설	연차별 투자계획	2024년 200백만원→ 50백만원	24. 5.	공약이행 평가단 의결
