

1-3		농산물 산지유통센터 건립 농업 활성화									
관리분야	지역경제					추진상황	정상추진(타당성 검토 용역 완료)				
사업구분	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별			소요사업비
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
	○		○			○			○		7,070백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2022~2026			팀 장 남가영(☎1871)		
			○	○							
주관부서	농업정책과				관련부처	해당없음					

□ 사업 개요

- 사업목표 : 농산물 산지유통센터의 건립으로 농가수익증대 및 농촌인력 부족해소
- 사업위치 : 흥성군내
- 사업규모 : 산지유통센터건립(2동 1,650㎡, 저온저장, 선별실, 작업장, 사무실) 장비구입(유통차량, 선별기, 포장기, 파렛트, 지게차 등)
- 사업내용 : 농산물의 규격화. 상품화에 필요한 집하.선별. 포장 및 출하등의 복합기능을 갖춘 산지유통시설의 건립

□ 그동안 추진실적

- 2021. 7. : 원예산업발전계획 수립을 위한 실무위원회 구성(7명)
- 2022. 6. : 산지유통활성화 시군순회 간담회 개최(흥성군농업기술센터, 14명)
- 2022. 9. 19. : 흥성농정발전 포럼개최(군청회의실, 25명, 산지유통센터 설립방향 주제발표 및 토론)
- 2022. 11. : 산지유통센터 건립 타당성용역 예산반영(22백만원)
- 2022. 11. : 흥성군산지유통센터건립을 위한 타당성검토 용역 추진계획 수립
- 2023. 3. 6. : 흥성군 산지유통센터 건립을 위한 타당성 검토용역 계약 및 착수
- 2023. 7. : 흥성군 산지유통센터 건립을 위한 타당성 검토용역 완료
 - ⇒ 기존 지역농협에서 운영하고 있는 APC 유사 시설 활용하여 2~3개의 품목으로 2가지 모델 중소규모의 APC 설립 추진

<구근, 양념채소류 중심 APC>
✓ 서부권역
✓ 마늘, 양파, 감자 등
☞ 서부농협 산지유통시설 추진 중

<과수, 과채류 중심 APC>
✓ 흥성, 흥북, 금마권역
✓ 딸기, 방울토마토, 오이 등
☞ 지역농협 지속적 협의 및 설득

※ 서부농협 산지유통시설(흥성마늘) 건립 추진현황

- 위치 : 흥성군 서부면 광리 730-4
- 면적 : 대지 6,241㎡, 건축 2,868㎡(기존 2,306 증축 562)

- 시 설 : 저온저장고, 선별장, 창고, 상품화기계(선별기 및 포장기계)
- 지원내역
 - 2021. 8. : 충남오감주관농협지원사업 추진(포장기계 구입, 집하시설 보수)
 - 2022. 1. : 유통시설현대화 사업 추진(저온저장고 및 선별장(492㎡), 창고(70㎡))
 - 2023. 3. : 농산물 유통시설 현대화 보완사업 추진(인테리어 300대)
 - 2022. ~ 2023. : 공선출하 생산자조직 육성사업(2년차 사업)
 - 2023. 9. : 2024년 저온유통체계 구축사업 농식품부 공모 선정

□ 문제점 및 대책

- 국·도비 보조사업의 경우 신청자격에 미달하여 준비만으로 추진하여야 함
⇒ 기존 지역농협에서 운영하고 있는 유사시설을 활용하여 예산절감 추진
- 연중 산지유통센터를 가동할 수 있는 대표품목과 취급물량 부족, 운영비 문제 (적자)로 주도적 운영조직 부재
⇒ 선별비, 물류비 등 산지조직 육성비용 지원 등의 적극적 대안 제시로 지역 농협으로 하여금 통합마케팅조직(조합공동법인) 구성토록 추진

□ 향후 추진계획

- 2023. : 농가 조직화 및 공선출하회 구성, 산지유통센터 운영조직 구성을 위해 지역농협과 지속적 협의와 설득
- 2024. : 산지유통센터 건립 기본계획 수립, 지방재정 투자심사(자체심사) 공선출하 생산자조직 육성사업 추진으로 농가 조직화 산지유통센터 운영조직 구성을 위해 지역농협과 지속적 협의와 설득
- 2025. : 사업예산 반영, 통합마케팅조직 구성, 건축물 설계 및 착공
- 2026. : 건축물 완공 및 유통·선별·포장장비 구입, 농산물 산지유통센터 운영

□ 연차별 추진계획

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	산지유통활성화 시군간담회 및 흥성농정발전포럼 추진	산지유통센터 건립 타당성 검토용역 완료 통합조직 구축 관련 지속협의	통합조직 구축 관련 지속협의, 산지유통센터 건립기본계획 수립	통합조직 구성 건축설계 및 착공	건축완공 및 유통선별포장 장비 구입, 산지유통센터 운영	산지유통센터 운영

□ **공약달성 확인지표**

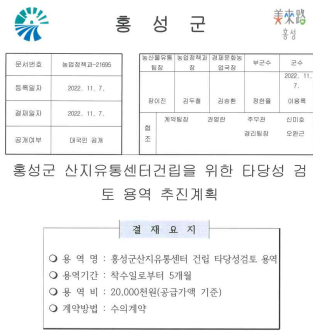

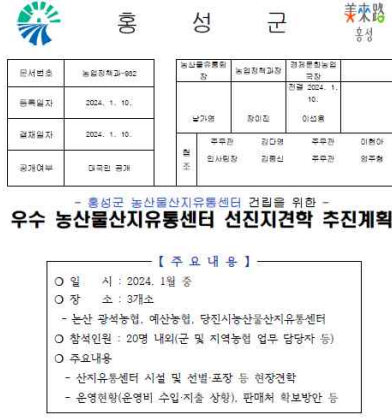
구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	산지유통센터 건립	개소	1	-	타당성 용역완료	기본계획 수립	-	1	-
실적	산지유통센터 건립	개소			타당성 용역완료				
달성	산지유통센터 건립				달성				

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
-	-	-	-	1(포럼)

□ **증빙자료 첨부**

 <p>홍성군 산지유통센터건립을 위한 타당성 검토 용역 추진계획</p> <p>결재요지</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 용역명 : 홍성군산지유통센터 건립 타당성검토 용역 ○ 용역기간 : 착수일로부터 5개월 ○ 용역액 : 20,000천원(공급가액 기준) ○ 계약방법 : 수의계약 <p>경제문화농업국 (농업정책과)</p>	 <p>홍성군 산지유통센터건립 타당성 검토 용역</p> <p>2023.07.03.</p>																																																																	
<p>2024년 저온유통체계 사업대상자 선정결과 및 예산 가내시</p> <p>□ 산지저온시설(4개소)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">시군</th> <th rowspan="2">법인명</th> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">유형</th> <th rowspan="2">규모(㎡)</th> <th colspan="5">사업비(천원)</th> </tr> <tr> <th>계(100%)</th> <th>국비(30%)</th> <th>도비(15%)</th> <th>시군비(15%)</th> <th>저담(40%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>합계</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td>1,741</td> <td>1,588,300</td> <td>479,490</td> <td>239,745</td> <td>239,745</td> <td>639,320</td> </tr> <tr> <td>공주</td> <td>우성농업협동조합</td> <td>저장고</td> <td>개보수</td> <td>352</td> <td>168,300</td> <td>50,490</td> <td>25,245</td> <td>25,245</td> <td>67,320</td> </tr> <tr> <td>공주</td> <td>의당농업협동조합</td> <td>산별장</td> <td>신구</td> <td>400</td> <td>360,000</td> <td>108,000</td> <td>54,000</td> <td>54,000</td> <td>144,000</td> </tr> <tr> <td>금산</td> <td>단인산농업협동조합</td> <td>저장고</td> <td>신구</td> <td>660</td> <td>860,000</td> <td>258,000</td> <td>129,000</td> <td>129,000</td> <td>344,000</td> </tr> <tr style="border: 2px solid red;"> <td>홍성</td> <td>시부농업협동조합</td> <td>저장고</td> <td>개보수</td> <td>329</td> <td>210,000</td> <td>63,000</td> <td>31,500</td> <td>31,500</td> <td>84,000</td> </tr> </tbody> </table>	시군	법인명	구분	유형	규모(㎡)	사업비(천원)					계(100%)	국비(30%)	도비(15%)	시군비(15%)	저담(40%)	합계	4			1,741	1,588,300	479,490	239,745	239,745	639,320	공주	우성농업협동조합	저장고	개보수	352	168,300	50,490	25,245	25,245	67,320	공주	의당농업협동조합	산별장	신구	400	360,000	108,000	54,000	54,000	144,000	금산	단인산농업협동조합	저장고	신구	660	860,000	258,000	129,000	129,000	344,000	홍성	시부농업협동조합	저장고	개보수	329	210,000	63,000	31,500	31,500	84,000	 <p>홍성군 농산물산지유통센터 건립을 위한 우수 농산물산지유통센터 선진지검학 추진계획</p> <p>【주요내용】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 일 시 : 2024. 1월 중 ○ 장 소 : 3개소 - 논산 광석농협, 예산농협, 당진시농산물산지유통센터 ○ 참석인원 : 20명 내외(군 및 지역농협 업무 담당자 등) ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 산지유통센터 시설 및 전별 포장 등 현장견학 - 운영현황(운영비 수입·지출 상황), 판매처 확보방안 등 <p>경제문화농업국 농업정책과</p>
시군						법인명	구분	유형	규모(㎡)	사업비(천원)																																																								
	계(100%)	국비(30%)	도비(15%)	시군비(15%)	저담(40%)																																																													
합계	4			1,741	1,588,300	479,490	239,745	239,745	639,320																																																									
공주	우성농업협동조합	저장고	개보수	352	168,300	50,490	25,245	25,245	67,320																																																									
공주	의당농업협동조합	산별장	신구	400	360,000	108,000	54,000	54,000	144,000																																																									
금산	단인산농업협동조합	저장고	신구	660	860,000	258,000	129,000	129,000	344,000																																																									
홍성	시부농업협동조합	저장고	개보수	329	210,000	63,000	31,500	31,500	84,000																																																									
