

2-15

홍성천 자연생태 테마공간 조성

관리분야	농어촌환경				추진상황	정상추진(공사중)					
사업구분	성격별		기간별(임기내)		사업비별		재원별			소요사업비	
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비		기타
	○		○			○			○		1,500백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2023~2024		팀 장 한재교(☎1843) 담당자 우진현(☎1497)			
주관부서	안전관리과				관련부처	충청남도					

□ 사업 개요

- 사업목표 : 월계천·홍성천 연계된 수변 산책로 조성으로 친수공간 확보를 통한 원도심주민의 여가생활 제공 및 시가지 환경개선 기여
- 사업대상 : 홍성천(대교리 홍주의사총 앞 ~ 내법리 삼교천 합류지점)
- 사업내용 : 산책로 조성 L=1.2km(양안 2.4km), B=3.0m
- 산책로 조성(L=2,400m, B=3.0m), 저수호안 정비(L=895m, H=2.0m)

□ 그동안 추진실적

- 2022. 10. : 특별조정교부금 신청 및 교부결정(6차), 400백만원
- 2023. 5. : 실시설계 완료
- 2023. 6. : 일상감사 및 계약심사(충청남도)
- 2023. 7. : 사업발주 및 공사착공(1차분)
- 2023. 12. : 저수호안 설치(L=0.8km) 완료 및 동절기 공사중지

□ 향후 추진계획

- 2024. 3. : 동절기 공사중지 해제 및 재착공
- 2023. 4. : 1차분 사업완료 및 2차분 착공
- 2023. 5. : 2차분 산책로 포장 완료

□ 연차별 추진계획

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	-	실시설계 및 1차분 공사	2차분 공사	-	-	-

□ **공약달성 확인지표**

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	산책로 조성	m	2,400	-	1,400	1,000	-	-	-
실적				-	-	-			
달성				-	추진중	추진중			

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)


설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
1	-	-	-	-

□ **증빙자료 첨부**

○ 사업위치도



○ 현장 사진

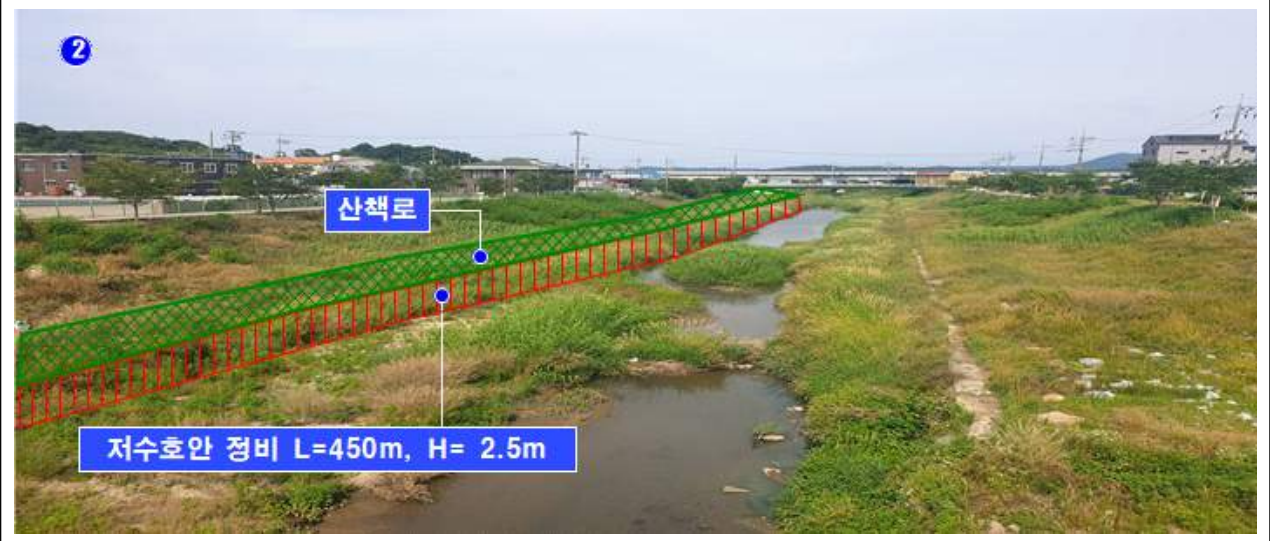

□ 공약 변경사항

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비 고
2-15	홍성천 자연생태 테마공간 조성	소요사업비 변경	1,050백만원→ 1,500백만원	'23. 11.	공약이행 평가단 의결
		사업기간 변경	당초: 2022~2023 변경: 2023~2024		
