

5-16

서부면 노인회 분회 사무실 확장 증축

관리분야	균형발전				추진상황	정상추진				
사업구분	성격별		기간별(임기내)		사업비별		재원별		소요사업비	
	신규	계속	완료	착수	예산	비예산	국도비	군비		기타
	○		○		○			○		80백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2024			팀 장 장현모(☎1838) 담당자 남희성(☎1316)	
			○							
주관부서	가정행복과				관련부처	보건복지부				

□ 사업 개요

- 사업목표 : 서부면 노인회 분회 사무실 확장 증축
- 사업대상 : 대한노인회 홍성군지회 서부면분회(대표: 정흥모)
- 위치 : 홍성군 서부면 이호리 253-7(면적: 225㎡)
 - ※ 소유권(토지) : 홍성군 공유재산(재산관리관 : 서부면)
- 사업비 : 80백만원(군 80)
 - ※ 산정기준 : 「홍성군 마을회관 지원에 관한 조례」 대수선, 증축 기준 준용
- 사업기간 : 2024.
- 사업내용 : 서부면 노인회 분회 사무실 확장 증축

□ 그동안 추진실적

- 2023. 9. : 서부면 노인회 분회 사무실 확장 증축을 위한 부지 및 방향성 협의
- 2023. 9. : 2024년도 본예산편성을 위한 서부면 노인회 분회 사무실 확장 증축 계획 수립
- 2024. 2. : 서부면 노인회 분회 사무실 설계용역
- 2024. 4. : 설계 용역 완료

□ 문제점 및 대책

- 「홍성군 경로당 물품관리규정」 준용, 2021년 서부면분회 사무실 이전 및 리모델링 지원(37,000천원) 이력으로, 3년간 지원 제한
- 이에, 2024년 확장 증축 부지 협의 및 지원계획 수립을 통한 확장 증축 지원

□ 향후 추진계획

- 2024. 5. : 서부면 노인회 분회 사무실 증축 시공 업체 선정
- 2024. 6. : 서부면 노인회 분회 사무실 증축 착공
- 2024. 9. : 서부면 노인회 분회 사무실 증축 준공

□ 연차별 추진계획

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	-	-	지원계획 수립. 착공 및 준공	-	-	-

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
서부면 노인회 분회 사무실 확장 증축	80	-	-	-	80	-	-	-

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	80	-	-	-	80	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	80	-	-	-	80	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 재원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ **공약달성 확인지표**


구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	조성여부	개소	1	시기 미도래		1	-	-	-
실적						-	-	-	-
달성						추진중	-	-	-

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
-	-	-	-	-


□ **증빙자료 첨부 (보도자료, 공문, 현장 사진, 조감도 등)**

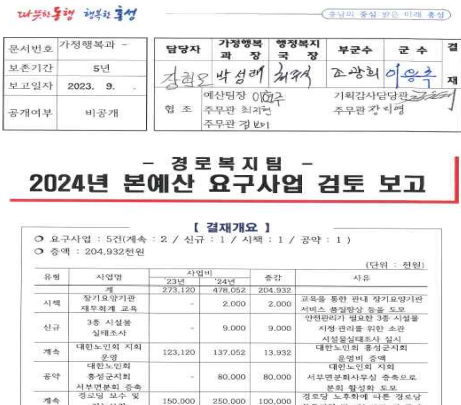

2024년 본예산 요구사업 검토 보고

○ 요구사업 : 5건(개축 : 2 / 신규 : 1 / 시책 : 1 / 공약 : 1)
○ 총액 : 204,932천원

유형	사업명	사업비		총합	비율
		23년	24년		
시책	장기요양기관 대부분계 구축	273,120	478,052	204,932	2,000
신규	3층 시설물 실체조사	-	9,000	9,000	9,000
개축	대한노인회 지회 운영	123,120	137,052	13,932	13,932
공약	대한노인회 홍성군지회 서부면분회 증축 경로당 요구 및 기능보강	-	80,000	80,000	80,000
계속		150,000	250,000	100,000	100,000

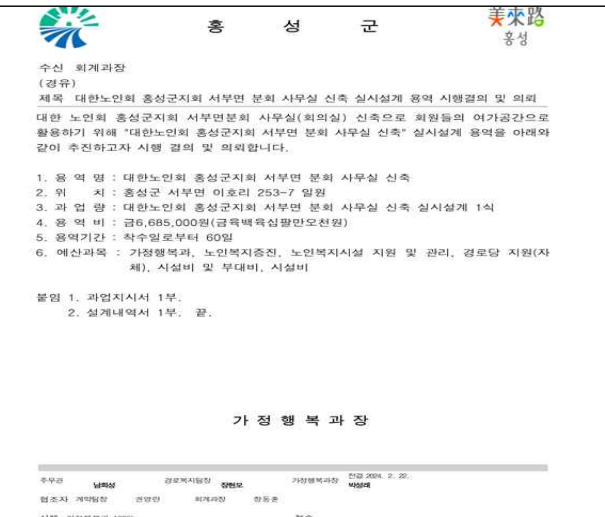

홍 성 군

수신 회계과장
(경유)
제목 대한노인회 홍성군지회 서부면 분회 사무실 신축 실시실계 용역 시행결의 및 의뢰
대한 노인회 홍성군지회 서부면분회 사무실(회의실) 신축으로 회관들의 여가공간으로
활용하기 위해 "대한노인회 홍성군지회 서부면 분회 사무실 신축" 실시실계 용역을 아래와
같이 추진하고자 시행 결의 및 의뢰합니다.

1. 용역 명 : 대한노인회 홍성군지회 서부면 분회 사무실 신축
2. 위 치 : 홍성군 서부면 이호리 253-7 일원
3. 과 업 량 : 대한노인회 홍성군지회 서부면 분회 사무실 신축 실시실계 1식
4. 용역비 : 금6,685,000원(금액백역십팔만오천원)
5. 용역기간 : 착수일로부터 60일
6. 예산과목 : 가정행복과, 노인복지증진, 노인복지시설 지원 및 관리, 경로당 지원(자
재), 시설비 및 무대비, 시설비

붙임 1. 과업지시서 1부.
2. 설계내역서 1부. 끝.

가정 행복 과장

주무관 **남재성** 경로복지팀장 **장병호** 가정행복과장 **이성태** 인공 2024. 2. 29.
협조자 계막담당 **권영민** 회계과장 **황동훈**
시행 가정행복과-12965 협수
우 32228 충청남도 홍성군 홍성읍 아문길 27, 가정행복과 / http://hongseong.go.kr

