

관리분야	문화관광				추진상황		정상추진			소요사업비	
	성격별	기간별(임기내)			사업비별		재원별				
사업구분	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
			○	○			○		○	○	
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2023~2026			팀 장 김용덕(☎1813) 담당자 김아라(☎1237)		
			○								
주관부서	문화관광과				관련부처	국토교통부 문화체육관광부					

□ 사업 개요

- 사업목표 : 지역과 학교의 연대를 통해 주민 및 학생들이 모두 이용할 수 있는 지역 커뮤니티 거점 공간 조성
- 사업대상 : 홍성군 광천읍 신진리 367-6(K-POP고등학교 내)
- 사업내용 : 주거지주차장 및 생활문화센터 조성(연면적 1,864.06㎡)
 - 지하1층~지상1층 주거지주차장, 학습공간, 마주침공간
 - 지상2층 다목적강당

□ 그동안 추진실적

- 2022. : 기본계획 수립완료 및 실시설계용역 착수
- 2023. : 실시설계용역 완료
- 2024. : 건립공사 착공

□ 향후 추진계획

- 2025. 3. : 준공
- 2025. : 문화센터 운영 및 관리
- 2026. : 문화센터 운영 및 관리
- 임기 후 : 문화센터 운영 및 관리

□ 연차별 추진계획

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	기본계획 수립 완료 및 실시설계 용역 착수	실시설계용역 완료	공사 착공·준공	문화시설 운영 및 관리	문화시설 운영 및 관리	문화시설 운영 및 관리

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
광천문화복합센터 건립	5,500	500	2,500	2,500	-	-	-	-

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	5,500	450	2,525	2,525	-	-	-	-
국 비	1,625	250	1,375	-	-	-	-	-
도 비	1,375	-	-	1,375	-	-	-	-
군 비	2,500	200	1,150	1,150	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 재원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	5,500	202	3,000	116	2,500	409	-	-	-	-	-	-
국 비	1,625	110	1,300	58	1,100	237	-	-	-	-	-	-
도 비	1,375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	2,500	92	1,700	58	1,400	172	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	광천문화복 합센터 건립	공정 률	100	10	50	100	-	-	-
실적				10	30	55	-	-	-
달성				달성	추진중	-	-	-	-

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
1	8	1	1	-


□ **증빙자료 첨부**



광천문화복합센터



사업대상지
출입문 예정지

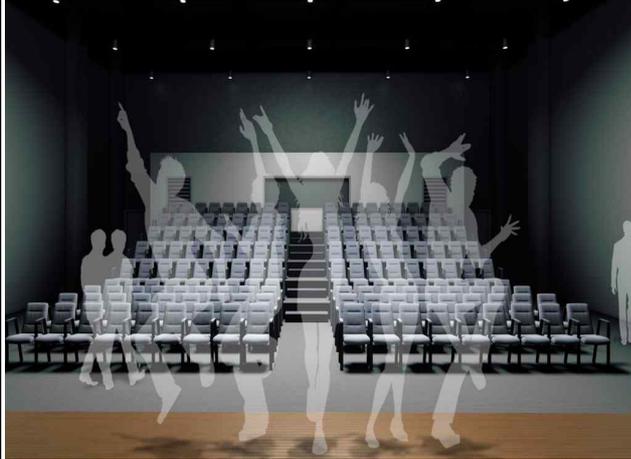

중도일보



금강일보

중도일보 2022년 10월 14일 (수) 14면 14번 지면

홍성 '광천문화복합센터' 당선작

홍성 광천문화복합센터 건립 '속도'

설계 공모작 선정-내년 착공 계획
K-POP고등학교 내 지상2층 규모

홍성군이 주민과 학생들의 다양한 문화 욕구를 충족시키고 생활문화 활동공간을 제공하기 위해 건립하고 있는 '광천문화복합센터'가 지난주 설계 공모를 끝내 본격적인 속도를 올리고 있다.

광천문화복합센터는 2020년 9월 문화체육관광부와 국토교통부의 생활 SOC 복합형 공모사업에 선정, 총 55여명의 사업자를 대상으로 광천읍 신진리(K-POP고등학교)에 연면적 1700㎡(지하 1층-지상 2층) 규모로 건립을 추진하고 있다.

2024년 6월 준공을 목표로 건립중인 광천문화복합센터는 공유재산 관리계획승인, 투자심사 승인 등 사전 행정 절차를 마친다고 9-10월 초 건축 설계 제안 공모와 심사위원회 의견을 거쳐 최종 당선작을 결정했다.

홍성-김재수 기자 kja0328@...

금강일보 2022년 10월 14일 (수) 13면 13479

홍성 광천문화복합센터 건립 순항

설계 공모 당선작 결정
2024년 6월 준공 목표

지역주민들의 문화 욕구 충족을 위해 추진 중인 광천문화복합센터 건립이 순항하고 있다.

홍성군은 2024년 6월 준공 목표로 추진 중인 광천문화복합센터가 지난주 설계 공모를 끝내고 본격적인 건립에 들어갔다.

지난 2020년 9월 문화체육관광부와 국토교통부의 생활 SOC 복합형 공모사업 선정으로 추진되는 광천문화복합센터는 광천읍 신진리(K-POP고등학교)에 연면적 1700㎡(지하 1층-지상 2층) 연면적 1700㎡ 규모로 건립된다.

군은 그동안 공유재산 관리계획 승인, 투자심사 승인 등 사전 행정 절차를 마무리하고 지난 10월

초까지 건축 설계 제안 공모와 심사위원회 의견을 거쳐 최종 당선작을 결정했다.

당선작은 중앙건축사사무소 위아에서 제출한 작품으로, 다목적 강당 계획이 우수하고 공간 활용성이 높다는 점 등에서 높은 평가를 받았다.

광천문화복합센터에는 주차 및 지역공동체를 위한 마추린 공간, 다목적 강당 등을 조성해 지역주민들의 여가문화와 주차 공간으로 제공하게 된다.

광천읍 문화관광과장은 "광천문화복합센터는 주민과 학생들의 소독과 교류를 활성화할 수 있는 공간으로 거듭날 것"이라며 "연내 착공으로 거듭날 것"이라며 "연내 착공하는 등 차질 없이 건립하도록 노력하겠다"고 말했다.

홍성-이서호 기자

□ **공약 변경사항**

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비고
3-14	광천 문화복합센터 건립	사업기간	당초: 2021~2024 변경: 2023~2026	23. 11.	공약 이행평가단 의결
