

5-14

결성면 스포츠타운 조성

관리분야	균형발전				추진상황	정상추진(사전절차 진행)					
사업구분	성격별		기간별(임기내)		사업비별		재원별			소요사업비	
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비		기타
	○		○			○		○	○		16,000백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2023~2026		팀 장 이주형(☎1868) 담당자 이용현(☎1991)			
주관부서	교육체육과				관련부처	교육부					

□ 사업 개요

- 사업목표 : 소외된 지역주민의 체육활동과 여가활동을 통한 건강증진 및 각종대회와 전지훈련 유치 등을 통한 스포츠 관광객 유입 등 지역 경제 활성화 도모
- 사업대상 : 결성면 읍내리 29번지 일원(舊 결성중)
- 사업내용 : 제2야구장(부대시설 포함)을 조성하여 제1야구장 및 다목적체육관과 연계한 스포츠타운 조성
 - ※ 2023년 교육부 학교복합시설 공모사업 선정에 따른 <홍성군 학교복합문화 스포츠센터 건립>으로 사업확대

□ 그동안 추진실적

- 2022. 2. : 결성 제2야구장 조성사업 건의
 - ※ 홍성군 가축분뇨공공처리시설 설치사업 관련
- 2022. 4. : 결성면 현안사업 지원 협약 체결
- 2022. 12. : 결성스포츠타운 타당성 검토용역 완료
- 2023. 6. : 실시설계비 및 토지매입비 확보(950백만원)
- 2023. 7. : 홍성군-홍성교육지원청 학교 복합시설 공모사업 협약 체결
- 2023. 7. : 2024년 체육진흥시설 지원(전환사업) 예산 요구 제출(도)
- 2023. 8. : 교육부 학교복합시설 공모사업 신청
- 2023. 9. : 교육부 학교복합시설 공모사업 선정(5,200백만원 확보)
- 2023. 9. : 2024년 체육진흥시설지원(전환사업) 선정(600백만원 확보)
 - ※ 2023년 교육부 학교복합시설 공모사업 첫 시행, 전국 39개소 선정

□ 공모신청 사유

- 결성 다목적체육관 건축기획 용역 결과 당초 사업비 35억에서 15억 이상 사업비가 증가되어 군비 절감을 위해 결성 스포츠타운 조성(제2야구장)사업과 연계해 교육부 학교복합시설 공모사업을 신청하여 총사업비의 40% (5,200백만원) 확보
 - ※ 시설비 30% + 돌봄, 방과후 학교 사업연계 10% 가산

□ 문제점 및 대책

- 결성제2야구장 토지매입(사유지 28필지)에 대하여 소유자와의 협의가 어려울 가능성이 있음
→ 결성면 이장회의 및 주민자치회와의 협조를 통해 소유자와 원만한 합의가 될 수 있도록 지속적 노력
- 전지훈련 및 각종 대회 개최와 인근 숙박시설, 관광지 등을 연계한 체류형 관광 활성화로 지역경제 활성화 및 생활인구 증가를 통한 지방소멸위기 극복

□ 향후 추진계획

- 2024. 1. ~ : 매입예정 토지 감정평가 및 건축기획용역 실시
- 2024. 2. : 재정투자심사 실시
- 2024. 5. : 실시설계 및 토지매입 추진
- 2025. 1. : 공사착공
- 2025. 12. : 학교복합문화스포츠센터 건립 완료

□ 연차별 추진계획

비 고	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진계획	결성 스포츠타운 조성관련 타당성 검토 용역 완료	사전 행정절차 이행	부지매입 및 실시설계 완료	스포츠타운 완공	스포츠타운 운영

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위:백만원)

사업별	연도별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계		16,000	-	20	2,150	9,250	4,580	-	-
홍성군 학교복합문화 스포츠센터 건립		16,000	-	20	2,150	9,250	4,580	-	-

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	16,000	-	20	2,150	9,250	4,580	-	-
국 비	6,200	-	-	200	5,400	600	-	-
도 비	1,350	-	-	-	600	750	-	-
군 비	8,450	-	20	1,950	3,250	3,230	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 재원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	3,220	20	20	20	2,150	-	1,050	-	-	-	-	-
국 비	400	-	-	-	200	-	200	-	-	-	-	-
도 비	600	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	-
군 비	2,220	20	20	20	1,950	-	250	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	학교복합문화 스포츠센터 조성	퍼센트 (%)	100	5	20	60	100	-	-
실적				5	20				
달성				달성	달성	추진중			

□ 군민 소통 현황

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
1	-	1	-	1

충남 3개 지역에 학교복합시설 건립

천안·서산·홍성 교육부 공모사업 선정 ... 259억 지원받아

천안과 서산, 홍성 등 충남 도내 3개 지역에 학교복합시설이 건립된다.

13일 충남교육청에 따르면 교육부가 시행한 '2023년 학교복합시설 공모사업'에 천안, 서산, 홍성 등 도내 3개 지역이 모두 선정됐다. 학교복합시설은 학교와 지역이 필요로 하는 주차장, 수영장, 체육관, 도서관, AI정보센터 등 교육·돌봄, 문화, 체육 등 복합시설을 학교 부지에 설립하는 것으로 이번 공

모사업 선정에 따라 천안(천안제일고, 사업비 364억 원), 서산(안지초, 195억 원), 홍성(폐교 결성중, 사업비 160억 원) 등 3개 지역은 교육부로부터 총사업비 719억 원 중 259억 원의 사업비를 지원받게 된다. 천안은 천안제일고등학교 부지에 공원과 1500명 관람석 규모의 체육관을 포함한 다양한 복합문화시설을 갖춘 (가칭)충남체육문화복합센터를 조성한다. 서산은 안지초등


학교 부지에 수영장, 강당, 어린이 클라이밍실 등을 갖춘 (가칭)안지초복합문화센터를 건립한다. 홍성은 폐교 결성중학교 부지에 다목적체육관, 야구경기장을 갖춘 (가칭)홍성군학교복합문화스포츠센터를 설립한다.

충남교육청은 2027년까지 5년간 도내 모든 시군에 1개 이상, 총 15개 공모가 선정될 수 있도록 힘을 모으고 향후 설치-운영을 통해 다양한 돌봄, 문화, 체육, 복지 프로그램 등을 제공할 방침이다.

내포=이석호 기자

23.1 X 11.0 cm

2023년 학교복합시설 공모사업 선정결과(39개)

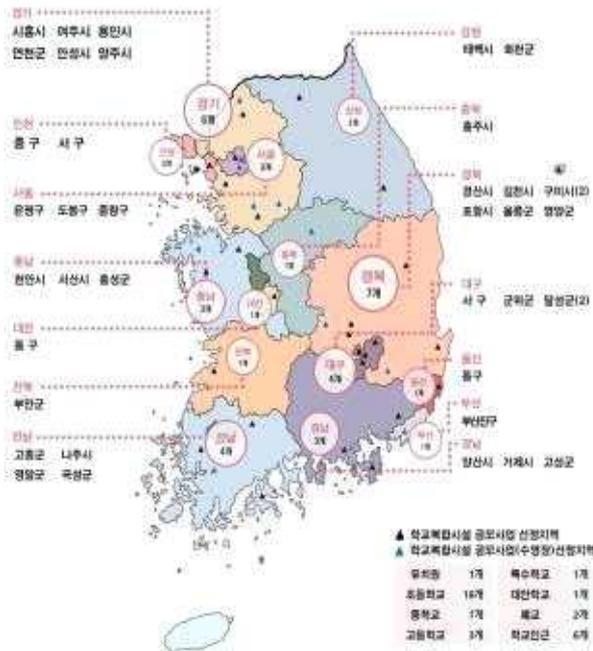

브릿지경제

2023년 10월 04일 (수)
17면 전국

홍성, 교육부 학교시설 공모 선정

충남 홍성군은 지역 균형발전 역점사업으로 추진 중인 결성스포츠타운 조성사업이 교육부 '2023년 학교복합시설 공모사업'에 최종 선정됐다고 3일 밝혔다. 이번 공모사업 선정으로 군은 총사업비 160억원 가운데 40%인 64억을 비롯해 향후 운영비 등을 지원받게 된다. 또 지난해 문체부 공모사업 선정으로 이미 확보된 국비 10억을 포함해 총사업비의 약 46% 이상인 74억을 확보하며 조성사업에 속도가 붙을 전망이다.

특히 군은 공모 선정을 통해 다초 완공 예정보다 1년 앞당긴 오는 2025년 12월 말까지 완공할 계획이다. 가칭 '홍성군 학교복합문화스포츠센터' 건립사업은 폐교부지를 활용해 조성된 '홍성만해야구장' 인근에 연면적 1100㎡ 규모의 다목적실내체육관과 공인규격의 제2야구장 및 부대시설등을 조성하는 사업으로 야구 특성화 시설로 건립해 관내 학생들의 방과후 학교, 돌봄프로그램 및 선수들의 전지훈련 장소로도 적극 활용할 계획이다.

홍성=김창영 기자 cy12200@viva100.com

8.8 X 12.7 cm
