

5-5

홍성군 반려동물 문화센터 건립추진

관리분야	균형발전					추진상황		정상추진		
	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별		소요사업비
사업구분	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	
		○		○			○		○	○
	3,800백만원									
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2023~2025			팀 장 홍성준(☎1970) 담당자 김은영(☎1938)	
			○							
주관부서	축산과				관련부처	농림축산식품부				

□ 사업 개요

- 사업목표 : 유기동물 발생 수 증가에 따른 위생적이고 체계적인 보호 관리가 가능하고, 올바른 반려문화 확산을 위한 동물보호센터 건립
- 사업대상 : 반려동물 문화센터 건립 1식
- 사업내용 : 유기동물 보호동, 행정실, 다목적실, 동물병원, 아미용실 등

□ 그동안 추진실적

〈2022년〉

- 2022.10.20. : 은하면 대천리 사업희망 토지주 면담 및 사업설명
- 2022.10.25. : 은하면 대천리 사업희망지 현장 확인
- 2022.11.28. : 은하면 대천리 마을주민 대표 대전시동물보호센터 견학

〈2023년〉

- 2023. 1.13. : '23. 동물보호센터 설치지원사업 선정 확정 통보(道 축산과-474)
- 2023. 4.19. : 은하면장 및 사업대상지 마을이장(합천) 사업계획 안내
- 2023. 4.20. : 사업대상지 인근 마을 이장(대천, 월실) 사업계획 안내
- 2023. 5.11. : 합천마을 주민대표(4명) 대전 동물보호센터 견학
- 2023. 5.22./ 5.25. : 합천마을 주민 및 면 주민자치회 위원 사업설명회
- 2023. 6. 5. : 은하면 기관·단체장협의회 사업설명회
- 2023. 7. 5. : 선진동물보호센터 주민견학
- 2023. 7. 6. : 반려동물 문화센터 사업대상지 보상계획 열람공고
- 2023. 7. 18. : 반려동물 문화센터 건립 사업유치 건의서 접수(은하면 기관단체장 및 마을 이장)
- 2023. 9. 4. : 사업수용 토지·건물 보상 및 등기이전 완료
- 2023. 10. 23. : 공공건축 사업계획 사전검토 의뢰
- 2023. 12. 28. : 道 공공건축심의위원회 심의(조건부 의결)
- 2024. 3. 25. : 道 공공건축심의위원회 심의 의결(조건부 처리계획 준수)

□ **향후 추진계획**

- 2024. 4. : 실시설계 용역발주
- 2024. 8. : 공사착공
- 2025. 4. : 공사준공

□ **연차별 추진계획**

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	-	부지선정	실시설계 발주 및 공사착공	공사준공	-	-

□ **연차별 투자계획**

- 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
반려동물 문화센터 건립	3,800	-	-	1,910	1,890	-	-	-

- 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	3,800	-	-	1,910	1,890	-	-	-
국 비	600	-	-	33	567	-	-	-
도 비	420	-	-	23	397	-	-	-
군 비	2,780	-	-	1,854	926	-	-	-

□ **연차별 자원 확보 및 집행내역**

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	3,800	1,853	-	-	2,800	1,853	510	-	490	-	-	-
국 비	600	2	-	-	300	2	300	-	-	-	-	-
도 비	420	2	-	-	210	2	210	-	-	-	-	-
군 비	2,780	1,849	-	-	2,290	1,849	-	-	490	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	반려동물 문화센터 건립 추진을	%	100	-	30	60	100	-	-
실적				-	30	5	-	-	-
달성				-	완료	추진중	-	-	-

## □ 군민 소통 현황

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
6	2 (자문, 사전검토)	20	-	3 (선진지견학)

## □ 증빙자료 첨부


### ○ 보도자료

<p><b>大田日報</b> 2022년 12월 20일 (화) 12면 지역</p> <h3>홍성 반려동물 인프라 구축</h3> <p>군·국·도비 22억 확보 문화센터 등 건립</p> <p>【홍성】홍성군이 반려동물 문화센터 건립과 반려동물 놀이터를 조성하는 등 반려동물 인프라 구축에 속도를 낸다.</p> <p>군에 따르면 반려동물 인프라 구축을 위해 국·도비 포함 22억원을 확보할 예정인 2023년 왕공 목표로 반려동물 놀이터와 2024년 반려동물 문화센터를 완공 목표로 잡았다. 반려인구가 상대적으로 많은 내포신도시 인근에 자리를 잡는다.</p> <p>11월 말 기준 홍성군의 동물등록 머릿수는 4979마리로 반려 인구가 대폭 늘었다.</p> <p>반려동물 관련 민원도 월평균 300여 건이 접수되는 등 반려인구 증가에 따른 상숙한 반려동물 문화</p> <p>조성을 위한 인프라 구축사업이 시급한 실정이라고 군은 설명했다.</p> <p>군은 반려동물 문화센터 건립을 추진하기 위해 국·도비 공모사업 공모와 사업부지 확보를 위해 후보지를 선정하고 주민설명회 개최, 주민견해를 실시하는 등 지속적인 노력을 기울여 왔다.</p> <p>타 시도 지자체에서 직접 운영하던 동물보호센터와 반려동물 공원 등 관련 인프라 시설을 권역하기도 했다. 동물 보호시설과 놀이시설의 기능뿐 아니라 경제적 활용 가치와 주민견해를 반영한 시설로 만들기 위한 방안 등을 강구했다.</p> <p>군은 반려동물 문화센터와 반려동물 놀이터 조성 등을 통해 동물산업의</p> <p>기업을 마련해 일자리 창출 효과와 지역경제에 새로운 활력소가 될 것으로 기대하고 있다.</p> <p>신인환 축산과장은 "반려인구 증가에 따른 관련 인프라 구축은 국민들의 건강한 정서 함양과 더불어 반려인과 반려동물이 행복할 수 있도록 만들어 가는 데 필요한 사업"이라며 "두 사업을 원활히 추진하기 위해서는 예산 시급 마당계를 거머쥔 신인생을 바라고 반려인구 1500만 시대에 맞는 의식 있는 국민들의 적극적인 협조를 부탁했다."</p> <p>한편 2021년 전국 통계조사를 보면 반려동물 양육 인구는 1500만 명으로 우리나라 국민의 28.9%가 반려동물을 키우고 있는 것으로 조사됐다.</p> <p>박교 기자 17.4 X 13.5 cm</p>	<p><b>중도일보</b> 2022년 12월 20일 (화) 14면 지역</p> <h3>홍성 반려동물산업 육성 탄력</h3> <p>내년 국·도비 22억원 확보 문화센터 놀이시설 등 추진</p> <p>홍성군이 2023년 반려동물 인프라 구축사업에 국·도비 포함 22억을 확보했다고 19일 밝혔다.</p> <p>군은 국·도비 예산확보로 반려동물 문화센터 건립과 반려동물 놀이터 조성 등 동물산업 육성에 탄력을 받을 것으로 보인다.</p> <p>이날 군에 따르면 11월 말 기준 동물등록 머릿수는 4979마리로 반려 인구가 대폭 늘어났으며, 반려동물 관련 민원도 월평균 300여건이 접수되고 있어 반려인구 증가에 따른 주민 수요에 대응하고 성숙한 반려동물 문화조성을 위한 관련 인프라 구축사업이 시급한 실정이라고 설명했다.</p> <p>군은 그동안 반려동물 문화센터 건립을 추진하고자 국·도비 공모사업에 응모하고</p> <p>사업부지 확보를 위해 후보지를 선정하고 주민설명회 개최 및 주민견해를 하는 등 지속적인 노력을 기울여 왔다. 타 시도 지자체에서 직접 운영하던 동물보호센터와 반려동물 공원 등 관련 인프라 시설을 권역하며 동물 보호시설과 놀이시설의 기능뿐 아니라 경제적 활용 가치와 주민견서 함양에 유용한 시설로 만들기 위한 방안 등을 강구해 왔다.</p> <p>특히 관련 사업인 반려동물 미용사, 훈련사, 펫시터, 펫 사진작가 등이 미래 유망직종으로 떠오르며, 타지자체의 경우 반려동물들 주제를 한 지역 축제가 경제활성화의 새로운 원동력이 되는 등 반려동물 사업을 점차 키우고 있기 때문에, 홍성군은 반려동물 문화센터와 반려동물 놀이 조성 등을 통해 동물산업의 기틀을 마련하여 일자리 창출 효과와 지역경제에 새로운 활력소가 될 것으로 기대하고 있다.</p> <p>홍성=김재수 기자 kis0328@ 14.3 X 13.4 cm</p>
---	---

### ○ 사업설명회



○ 선진동물보호센터 주민견학

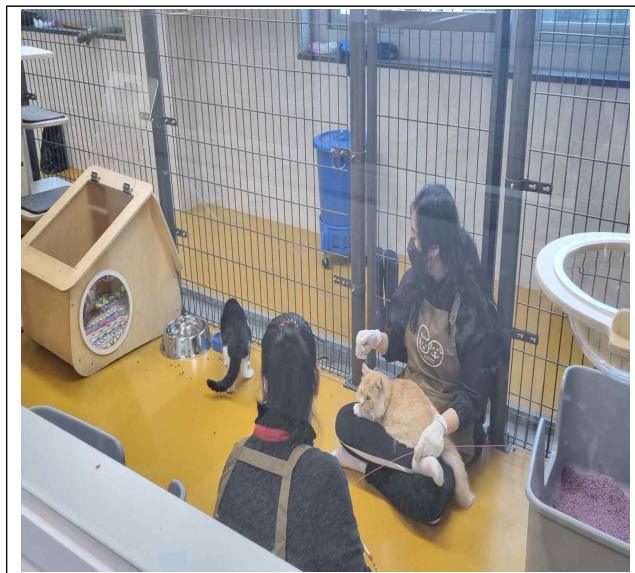

# 사업대상지

위치 | 은하면 대천리 (항공사진)



위치 | 조감도 및 배치도



## □ 공약 변경사항

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비 고
5-5	홍성군 반려동물 문화센터 건립추진	소요사업비 변경	2,000백만원 → 3,800백만원	23. 11.	공약이행 평가단 의결
		사업기간 변경	당초: 2022~2024 변경: 2023~2024		
		사업기간 변경 연차별 추진계획	당초: 2023~2024 변경: 2023~2025	24. 5.	
