

4-20

홍성군 스마트 어르신 놀이터 조성

관리분야	복지행정				추진상황	완료				
사업구분	성격별		기간별(임기내)		사업비별		재원별			소요사업비
	신규	계속	완료	착수	예산	비예산	국도비	군비	기타	
	○		○		○		○	○	○	700백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2022~2023			팀 장 장현모(☎1838) 담당자 최지유(☎1180)	
주관부서	가정행복과				관련부처	충청남도				

□ 사업 개요

- 사업목표 : 어르신 스마트 놀이터 조성
- 사업대상 : 관내 노인
- 사업내용 : 운동시설과 휴양시설 설치 및 다양한 참여형 프로그램 등을 마련하고, 인근시설(노인종합복지관등)들과 연계하여, 어르신들을 위한 참여형 어르신 놀이터를 조성

□ 그동안 추진실적

- 2022. 11. : 어르신 놀이터 조성 추진협의회 구성
- 2023. 4. : 추진협의회 개최, 놀이터 조성부지 선정 등 스마트 어르신 놀이터 조성(안) 확정
- 2023. 5. ~ 7. : 놀이터 리모델링 및 조경 실시설계 추진
- 2023. 6. : 상반기 지역현안 특별교부세 교부결정(사업비 2억원 추가 확보)
- 2023. 8. ~ 11. : 리모델링 및 조경 공사 착공 및 추진
- 2023. 12. : 어르신 놀이터 준공 및 민간위탁 체결
- 2024. 3. : 어르신 놀이터 개소식 및 운영

□ 연차별 추진계획

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	사전 준비 협의회 구성 및 회의 개최	실무 협의체 구성, 계획안 수립, 착공 및 준공	-	-	-	-

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
어르신 놀이터 조성	700	-	-	700	-	-	-	-

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	700	-	-	700	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	150	-	-	150	-	-	-	-
군 비	350	-	-	350	-	-	-	-
기 타	200	-	-	200	-	-	-	-

□ 연차별 재원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	700	662	500	-	200	662	-	-	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	150	147	150	-	-	147	-	-	-	-	-	-
군 비	350	344	350	-	-	344	-	-	-	-	-	-
기 타	200	171	-	-	200	171	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표


구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	어르신 놀이터 조성	개소	1	-	1	-	-	-	-
실적				-	1	-	-	-	-
달성				-	달성	-	-	-	-

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
1	-	-	-	-


□ **증빙자료 첨부**




『홍성군 스마트 어르신 놀이터』 추진 협의회 구성·운영 계획

(명 칭) 『홍성군 스마트 어르신 놀이터』 추진 협의회
 (구 성) 주민, 군의회, 전문가, 유관기관·단체, 공무원 등
 (운영기간) '22. 12. ~ 어르신 놀이터 건립(운영) 시 까지
 (주요기능) 어르신 놀이터 효율적 운영기간 구축 및 발전방안 논의

- ① 부서(팀) 및 민관기관 간 협의를 통하여 공조기반 강화
- ② 민간 및 관계기관의 자문 및 의견 수렴
- ③ 지역사회 협력적 네트워크 구축 기반 조성





홍 성 군

수신 내부결재 (공류)
 제과 홍성군 스마트 어르신 놀이터 추진협의회 회의

1. 가정행복과-65058(2023. 11. 29)와 관련됩니다.
 2. 홍성군 스마트 어르신 놀이터 효율적 운영기간 구축 및 기관간 업무협력 방안을 모색하기 위해 아래와 같이 추진협의회 회의를 실시하고자 합니다.

가. 일 시 : 2023. 4. 28(금) 14:00
 나. 장 소 : 홍주성역사관 체험학습실
 다. 참석인원 : 9명(공무원 4, 군의회 1, 혜련대학교 교수 1, 유관기관 2, 지역주민 1)
 라. 회의내용 : 스마트 어르신 놀이터 및 어르신 놀이터 조성, 활용 및 부대시설 결정
 - 어르신 맞춤형 운동시설 설치 및 커뮤니티 공간 조성
 - 디지털 장비들을 이용한 시니어 스마트 프로그램 도입
 - 공원 조성을 통한 휴양시설 설치

붙임 1. 회의자료 1부.
 2. 어르신 놀이터 배치도(안) 1부. 끝.

완 료 계

감독권 경유 **고성현** (인)


1. 용 의 명 : 스마트 어르신놀이터 리모델링 실시계획 용역
 2. 위 치 : 충청남도 홍성군
 3. 계약 금액 : 일괄일천구백십삼이천오천원정(₩19,125,000)
 4. 계약 년월일 : 2023년 05월 09일
 5. 착수 년월일 : 2023년 05월 12일
 6. 환 료 일 : 2023년 07월 28일
 7. 준 공 기 한 : 2023년 07월 30일

상 기 용역을 완료하였기에 완료계를 제출합니다.

2023년 07월 28일

상 호 : 한민건축사사무소
 전 화 : 041-633-5272
 주 소 : 홍성군 홍성읍 교동1리25번길 13 2층
 대 표 : 건축사 인 황 석

홍성군 재무관 귀하






본 사 : 경기도 파주시 평정로 96, 3층 402호 / TEL : 031-847-6501 / FAX : 021-866-6502 담당 : 김광선

문 서 번 호 : 청도 2023-07-031
 일 자 : 2023. 07. 31.
 수 신 : 홍성군
 장 소 : 가정행복과
 제 목 : 『스마트 어르신놀이터 실시계획 용역(조경)』 준공계 제출건

1. 귀 군의 무궁한 발전을 기원합니다.
 2. 귀 군과 계약 체결한 『스마트 어르신놀이터 실시계획 용역(조경)』과 관련하여 준공계를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 선처하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 준공계 -1부.

청도엔지니어링 대표이사 **김 광 선** (인)

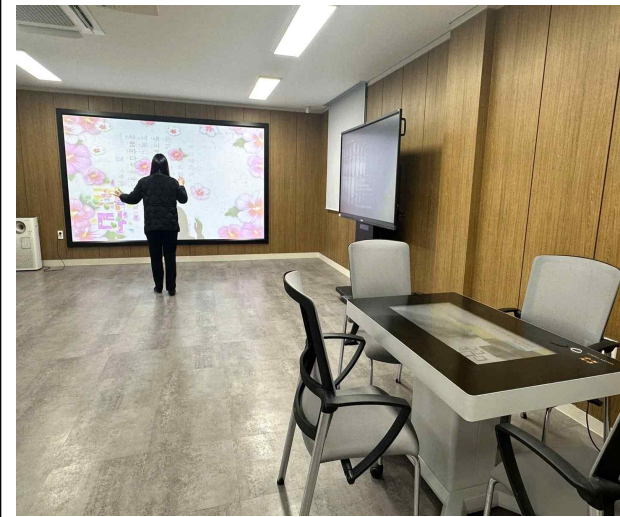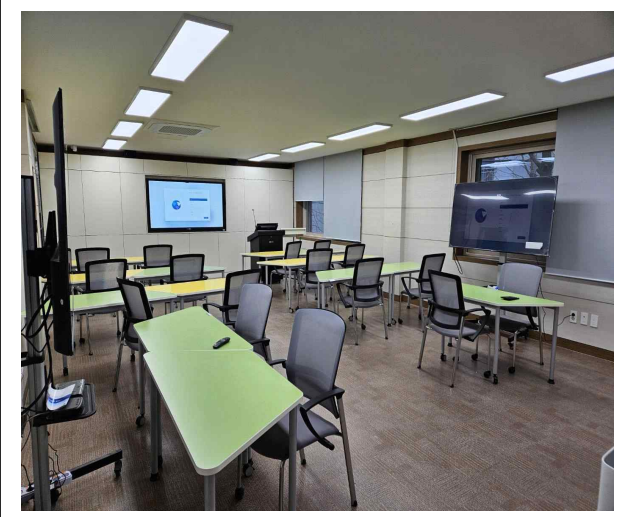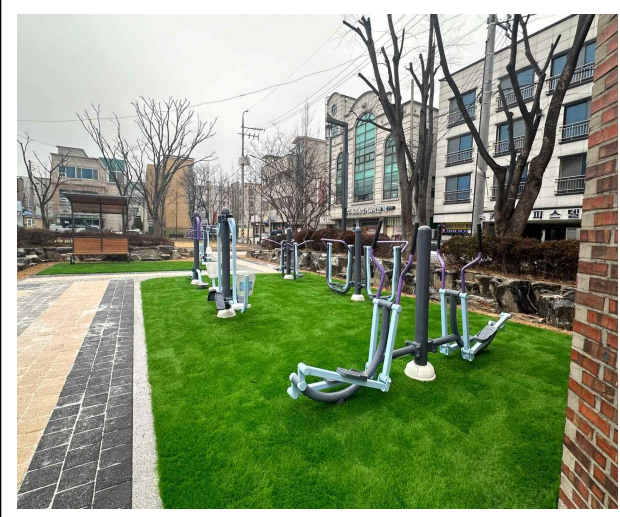

□ 공약 변경사항

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비 고
4-20	홍성군 스마트 어르신 놀이터 조성	사업비	500백만원→ 700백만원	23. 11.	공약 이행평가단 의결
